

旁站监理记录表

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号： LZGF—JLPZ—30

日期及气候：2019 年 11 月 09 日 晴 22-29℃

工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队



旁站监理的部位或工序：20MW6#光伏区箱逆变基础圈梁支模浇筑

旁站监理开始时间：14:00

旁站监理结束时间：18:30

施工情况：

- 1、浇筑施工人员 9 人，振动泵 1 个，铁锹 6 把。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。
- 3、混凝土等级为 C35，33m³。

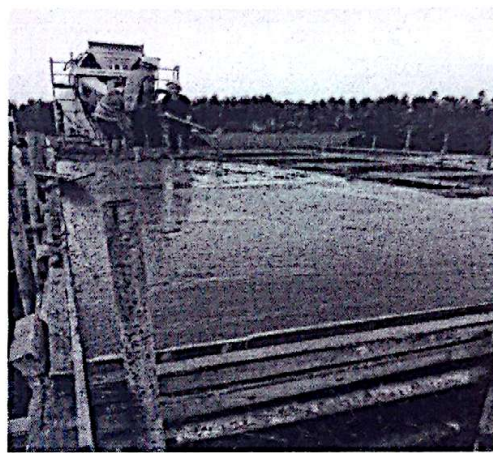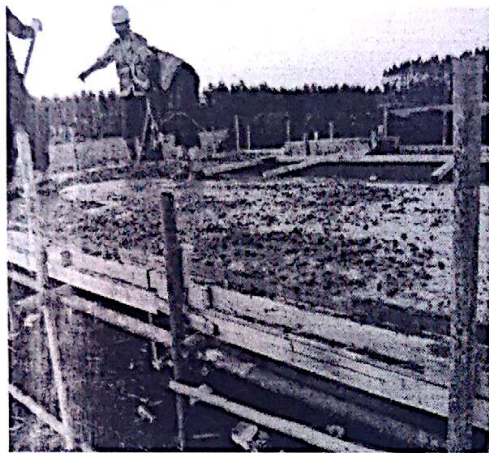

监理情况：

监理旁站时要求施工单位对基础圈梁浇筑时用振捣棒，以免拆模出现麻面。

处理意见：

现场已落实到位，未出现异常情况。

备注：

项目部： 雷州某利

质检员： 卡启华

2019 年 11 月 10 日

项目监理部： 雷州某利

旁站监理人员： 王洪

2019 年 11 月 9 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
