

旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目 编号：LZGF-JLPZ-31

日期及气候：2019 年 11 月 10 日 晴 22-29℃

工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队


旁站监理的部位或工序：40 兆瓦 25#光伏区箱变基础垫层浇筑

旁站监理开始时间：13:00

旁站监理结束时间：13:30

施工情况：

- 1、浇筑施工人员 10 人，混凝土搅拌车一台、振动泵 1 个，铁锹 6 把。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。
- 3、混凝土等级为 C15，11m³。

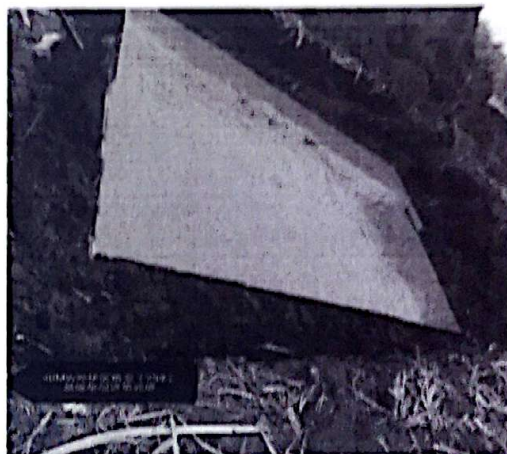

监理情况：

监理对基础垫层浇筑进行旁站。

处理意见：

现场未出现异常情况。

备注：

项目部：湛江聚能

质检员：卡启华

2019 年 11 月 11 日

项目监理部：湛江聚能

旁站监理人员：王洪

2019 年 11 月 10 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
