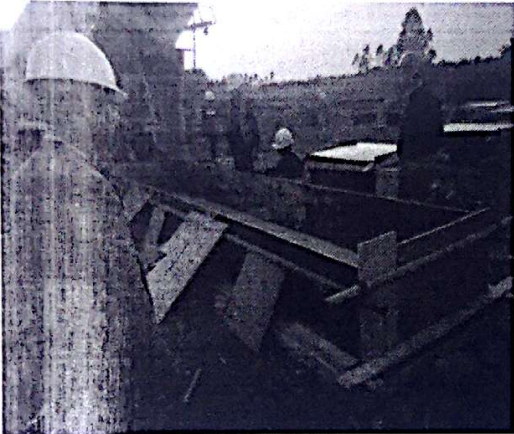
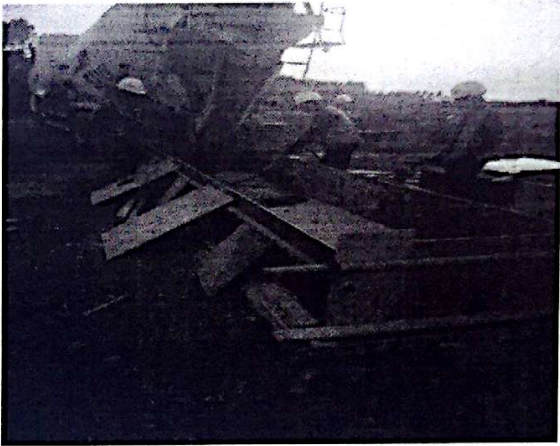


旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：LZGF—JLPZ—36

日期及气候：2019 年 11 月 10 日 晴 22-29℃	工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序：GIS 构架基础底板浇筑（素混凝土）	
旁站监理开始时间：18:30	旁站监理结束时间：20:30
施工情况： 1、浇筑施工人员 4 人，振动泵 1 个。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35，20m³。  	
监理情况： 监理对底板浇筑进行旁站。	
处理意见： 未发现异常情况。	
备注：	
项目部：湛江聚能 质检员：李启华 2019 年 11 月 11 日	项目监理部：湛江聚能 旁站监理人员：李卫忠 2019 年 11 月 10 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
