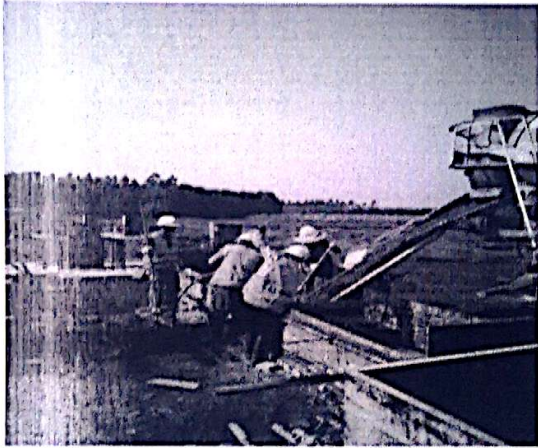


旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：LZGF-JLPZ-39

日期及气候：2019 年 11 月 15 日 晴 22-29℃	工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序：升压站 GIS 基础浇筑	
旁站监理开始时间：9:40	旁站监理结束时间：10:30
施工情况： 1、浇筑施工人员 4 人，铁锹 2 把，振动泵 1 个。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35，10m³。  	
监理情况： 监理对基础浇筑进行旁站，要求使用振动泵避免拆模后蜂窝麻面。	
处理意见： 已按要求实行，未发现异常情况。	
备注：	
项目部： <u>湛江聚能</u> 质检员： <u>李启华</u> 2019 年 11 月 16 日	项目监理部： <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员： <u>李卫忠</u> 2019 年 11 月 15 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
