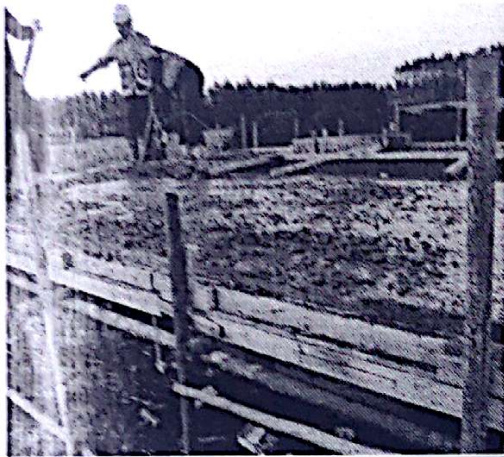
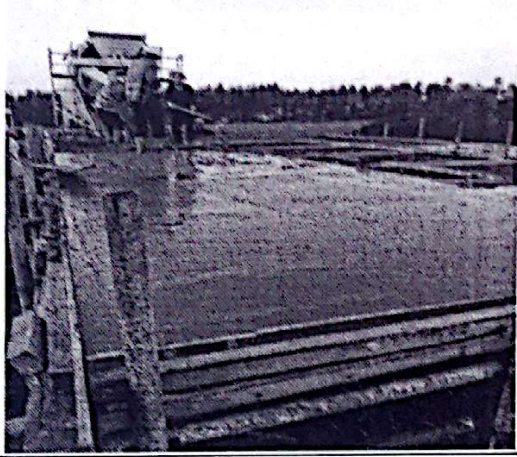


旁站监理记录表

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：LZGF-JLPZ-41

日期及气候：2019 年 11 月 15 日 晴 22-29℃	工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序：20MW 光伏区 8#区域箱逆变一体基础圆梁构造柱浇筑	
旁站监理开始时间：17:10	旁站监理结束时间：18:30
施工情况： 1、浇筑施工人员 4 人，铁锹 2 把，振动泵 1 个。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35，10m³。  	
监理情况： 监理旁站时要求施工单位对基础圈梁浇筑时用振捣棒，以免拆模出现麻面。	
处理意见： 现场已落实到位，未出现异常情况。	
备注：	
项目部：雷州荣利 质检员：卡启华 2019 年 11 月 16 日	项目监理部：雷州荣利 旁站监理人员：王强 2019 年 11 月 15 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
