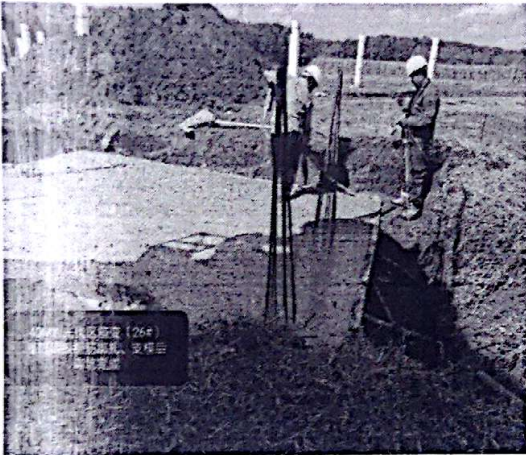
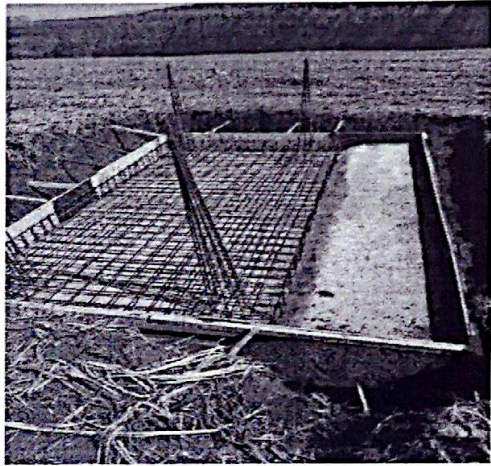


## 旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目      编号： LZGF—JLPZ—43

|                                                                                                              |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2019 年 11 月 17 日 晴 22-29℃                                                                              | 工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队                                                                                |
| 旁站监理的部位或工序：40MW 光伏区箱变 26#基础底板钢筋绑扎、支模后浇筑完成                                                                    |                                                                                                        |
| 旁站监理开始时间：13: 30                                                                                              | 旁站监理结束时间：14:00                                                                                         |
| <p>施工情况：</p> <p>1、浇筑施工人员 4 人，铁锹 2 把，振动泵 1 个。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。</p> <p>3、混凝土等级为 C35，12m³。</p> |                                                                                                        |
|                            |                     |
| <p>监理情况：</p> <p>监理对基础钢筋底板浇筑进行旁站。</p>                                                                         |                                                                                                        |
| <p>处理意见：</p> <p>现场未出现异常情况。</p>                                                                               |                                                                                                        |
| <p>备注：</p>                                                                                                   |                                                                                                        |
| <p>项目部： <u>湛江聚能</u></p> <p>质检员： <u>李良华</u></p> <p style="text-align: right;">2019 年 11 月 18 日</p>            | <p>项目监理部： <u>湛江聚能</u></p> <p>旁站监理人员： <u>QJH</u></p> <p style="text-align: right;">2019 年 11 月 17 日</p> |

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
