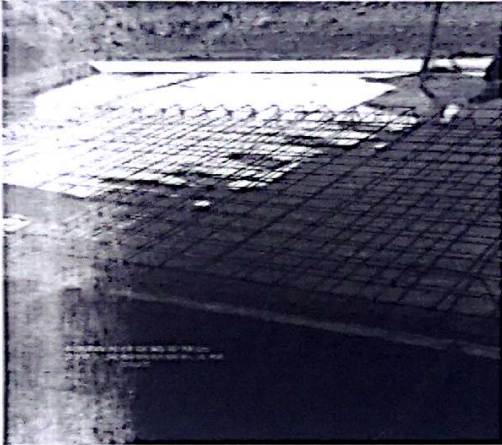


旁站监理记录表

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目 编号: LZGF—JLPZ—46

日期及气候: 2019 年 11 月 18 日 晴 15-28℃	工程地点: 广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序: 40MW 光伏区箱变 21#基础底板钢筋绑扎、支模后浇筑	
旁站监理开始时间: 14: 00	旁站监理结束时间: 15:10
施工情况: 1、浇筑施工人员 4 人, 铁锹 2 把, 振动泵 1 个。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35, 12m³。  	
监理情况: 监理对基础钢筋底板浇筑进行旁站	
处理意见: 现场未出现异常情况。	
备注:	
项目部: <u>湛江聚能</u> 质检员: <u>张华</u> 2019 年 11 月 19 日	项目监理部: <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员: <u>刘引利</u> 2019 年 11 月 18 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 四 份
