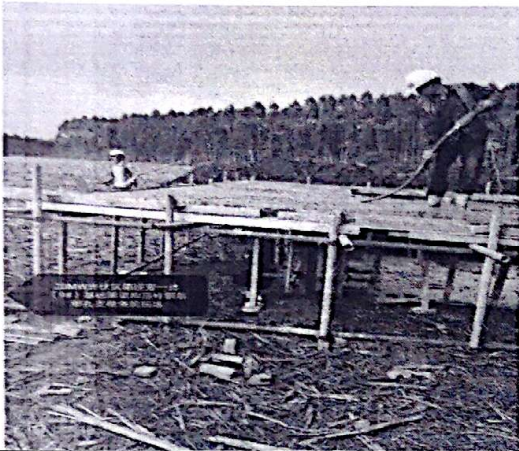
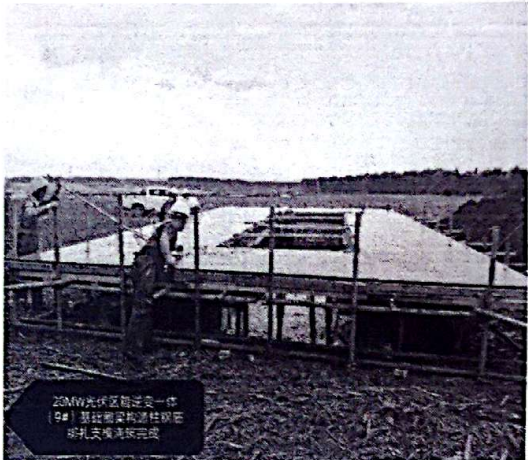


旁站监理记录表

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号： LZGF—JLPZ—47

日期及气候：2019 年 11 月 18 日 晴 15-28℃		工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队	
旁站监理的部位或工序：20MW 光伏区箱变 9#基础圆梁构造柱钢筋绑扎			
旁站监理开始时间：15: 30		旁站监理结束时间：17:10	
施工情况： 1、浇筑施工人员 4 人，铁锹 2 把，振动泵 1 个。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35，12m³。  20MW 光伏区箱变 9# 基础圆梁构造柱钢筋绑扎  20MW 光伏区箱变 9# 基础圆梁构造柱钢筋绑扎			
监理情况： 要求施工单位对基础垫层浇筑时用平板振动泵，以免拆模出现麻面。			
处理意见： 现场已落实到位，未出现异常情况。			
备注：			
项目部： <u>雷州英利</u> 质检员： <u>李启华</u> 2019 年 11 月 19 日		项目监理部： <u>雷州英利</u> 旁站监理人员： <u>张利</u> 2019 年 11 月 18 日	

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
