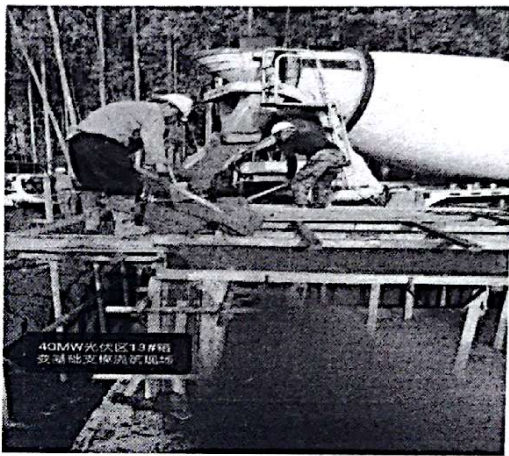


旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号： LZGF—JLPZ—54

日期及气候：2019 年 11 月 25 日 晴 15-28℃		工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队	
旁站监理的部位或工序：40 兆瓦光伏区 13#区域箱变基础浇筑			
旁站监理开始时间：15: 20		旁站监理结束时间：17:30	
施工情况： 1、浇筑施工人员 7 人，铁锹 5 把，振动泵 2 个。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35，26m³。			
			
监理情况： 监理对浇筑时进行旁站，要求使用振动泵，防止出现蜂窝麻面。			
处理意见： 现场已整改完成。			
备注：			
项目部： <u>湛江聚能</u> 质检员： <u>李启华</u> 2019 年 11 月 26 日		项目监理部： <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员： <u>王洪</u> 2019 年 11 月 25 日	

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
