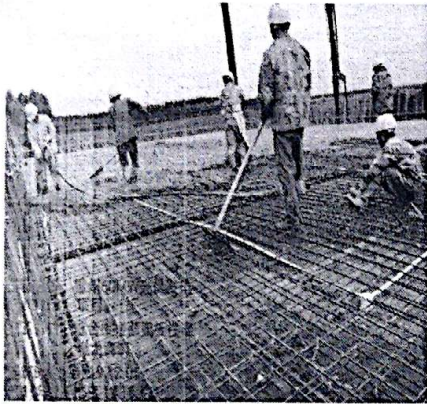


旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号： LZGF—JLPZ—57

日期及气候：2019 年 12 月 05 日 多云 15-28℃		工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队	
旁站监理的部位或工序：综合楼楼面梁板柱混凝土浇筑			
旁站监理开始时间：11:00		旁站监理结束时间：14:20	
施工情况： 1、浇筑施工人员 9 人，铁锹 5 把，振动泵 2 个。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35，85m³。			
			
监理情况： 监理对综合楼楼面梁板柱浇筑时进行旁站，要求施工人员楼面浇筑时，控制好双层双向钢筋间距及保护层。			
处理意见： 现场已按要求进行施工，未发现异常情况。			
备注：			
项目部： <u>湛江聚能</u> 质检员： <u>李启华</u> 2019 年 12 月 5 日		项目监理部： <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员： <u>李卫建</u> 2019 年 12 月 5 日	

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
