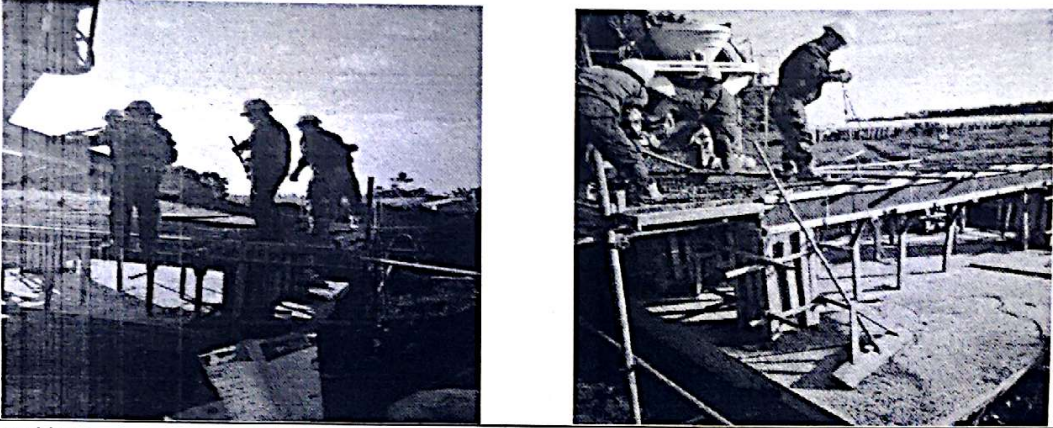


旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号： LZGF—JLPZ—60

日期及气候：2019 年 12 月 06 日 多云 15-28℃	工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序：40MW 光伏区 23#箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间：15:30	旁站监理结束时间：16:30
施工情况： 1、浇筑施工人员 8 人，铁锹 5 把，振动泵 2 个。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35，25m³。	
	
监理情况： 监理对 23#箱变基础浇筑进行旁站，要求施工人员浇筑时对基础圈梁浇筑时用振捣棒，以免拆模出现麻面。	
处理意见： 现场已按要求进行施工，未发现异常情况。	
备注：	
项目部： <u>湛江聚能</u> 质检员： <u>李国华</u> 2019 年 12 月 6 日	项目监理部： <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员： <u>王洪</u> 2019 年 12 月 6 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
