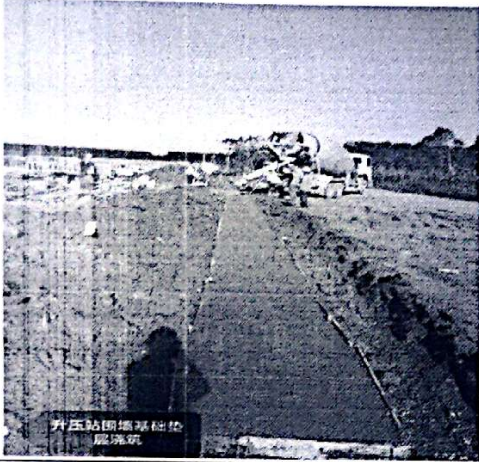


旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号： LZGF—JLPZ—66

日期及气候：2019 年 12 月 05 日 晴 15-22℃		工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队	
旁站监理的部位或工序：升压站围墙基础垫层浇筑			
旁站监理开始时间：16:20		旁站监理结束时间：17:10	
施工情况： 1、浇筑施工人员 7 人，铁锹 5 把，振动泵 2 个。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C15，9m³。			
 升压站围墙基础垫层浇筑		 围墙基础钢筋绑扎	
监理情况： 监理对升压站围墙基础垫层浇筑时进行旁站。			
处理意见： 现场未发现异常情况。			
备注：			
项目部： <u>湛江聚能</u> 质检员： <u>卡启华</u> 2019 年 12 月 5 日		项目监理部： <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员： <u>程卫忠</u> 2019 年 12 月 5 日	

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
