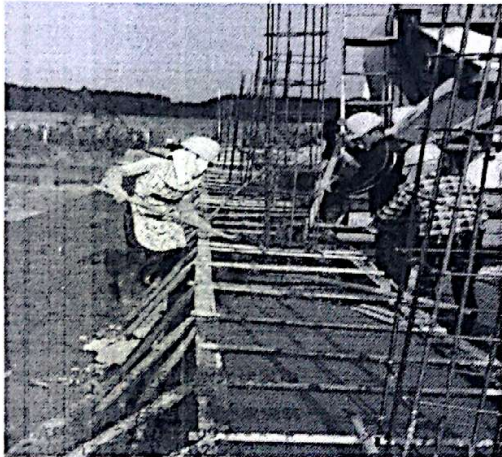


旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号： LZGF—JLPZ—69

日期及气候：2019 年 12 月 09 日 多云 12-21℃	工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序：升压站围墙地梁、围墙构造柱浇筑	
旁站监理开始时间：9: 02	旁站监理结束时间：12:35
施工情况： 1、浇筑施工人员 7 人，铁锹 4 把，振动泵 2 个。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35（全细石），12m³。  	
监理情况： 监理对升压站围墙地梁、围墙构造柱浇筑时进行旁站，要求施工人员浇筑时对基础圈梁浇筑时用振捣棒，以免拆模出现麻面。	
处理意见： 现场已按要求进行施工，未发现异常情况。	
备注：	
项目部： <u>湛江聚能</u> 质检员： <u>李启华</u>	项目监理部： <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员： <u>平卫忠</u>
2019 年 12 月 9 日	2019 年 12 月 9 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
