

旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目 编号： LZGF—JLPZ—8

日期及气候：2020 年 03 月 09 日 晴 17-30℃

工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队


旁站监理的部位或工序：40MW 光伏区 14#区灌注桩浇筑现场

旁站监理开始时间：09:20

旁站监理结束时间：16:30

施工情况：

- 1、浇筑施工人员 19 人，铁锹 5 把，振动泵 2 个、发动机 2 台。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土等级为 C35，60m³。

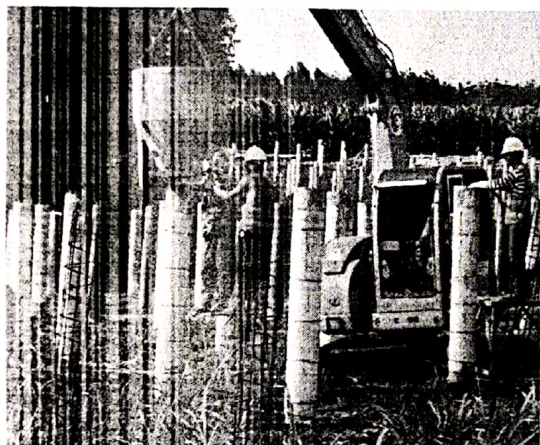

监理情况：

监理对浇筑时进行旁站，要求注意施工安全、确保施工质量。
做好成品桩的养护工作。

处理意见：

现场已落实。

备注：

项目部：

湛江聚能

质检员：

冯军

项目监理部：

湛江聚能

旁站监理人员：

李长春

2020 年 03 月 09 日

2020 年 03 月 09 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份



扫描全能王 创建
