

旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目 编号：LZGF—JLPZ—011

日期及气候：2019 年 11 月 5 日 晴 12-21℃	工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
--------------------------------	-------------------------



旁站监理的部位或工序：40 兆瓦光伏区 26#区灌注桩浇筑现场

旁站监理开始时间：9:10

旁站监理结束时间：16:10

施工情况：

- 1、浇筑施工人员 6 人，铁锹 4 把，振动泵 2 个。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土等级为 C35，75m³。

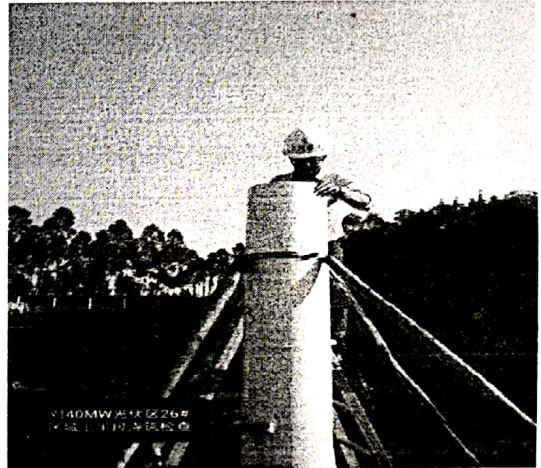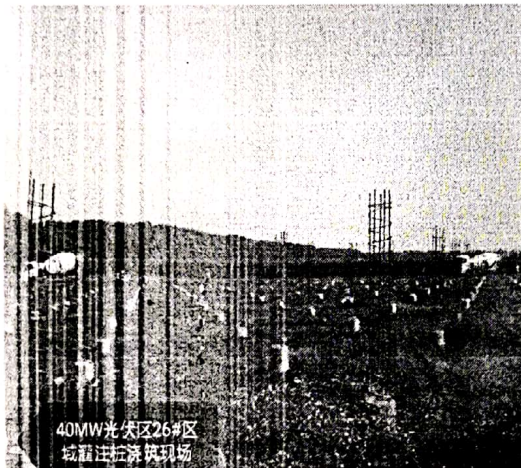

监理情况：

监理在浇筑前对钢筋笼检查。
要求抓好施工质量，现场施工安全。

处理意见：

现场已落实到位，未发现异常情况。

备注：

项目部： 湛江聚能
质检员： 张华

项目监理部： 湛江聚能
旁站监理人员： 张华

2019 年 11 月 5 日

2019 年 11 月 5 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份



扫描全能王 创建
