

## 旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目 编号： LZGF—JLPZ—013

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| 日期及气候：2019 年 12 月 19 日 晴 12-21℃ | 工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队 |
|---------------------------------|-------------------------|



旁站监理的部位或工序：40 兆瓦光伏区 13#区灌注桩浇筑现场

旁站监理开始时间：9:10

旁站监理结束时间：16:15

施工情况：

- 1、浇筑施工人员 6 人，铁锹 4 把，振动泵 2 个。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土等级为 C35，76m<sup>3</sup>。

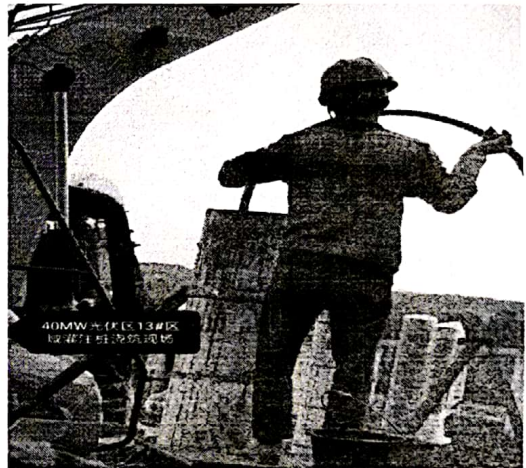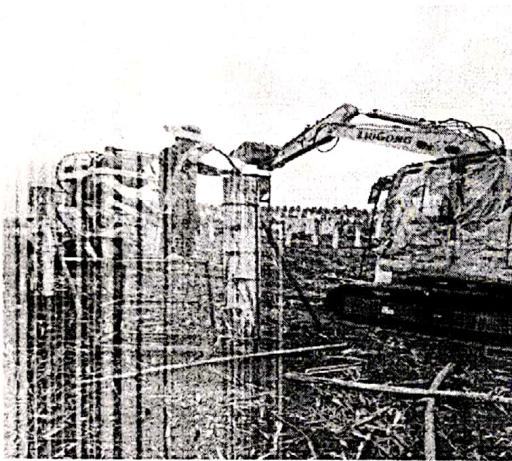

监理情况：

监理在浇筑前对钢筋笼检查。  
要求浇筑确保施工质量，抓好现场施工安全。

处理意见：

现场已落实到位，未发现异常情况。

备注：

项目部： 湛江聚能  
质检员： 李长

项目监理部： 湛江聚能  
旁站监理人员： 李长

2019 年 12 月 19 日

2019 年 12 月 19 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份



扫描全能王 创建
