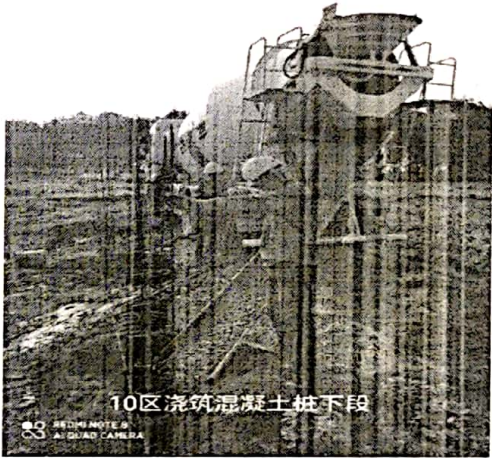


旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：LZGF—JLPZ—018

日期及气候：2020 年 04 月 18 日 晴 20-28℃	工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序：40 兆瓦光伏区 10#区灌注桩浇筑现场	
旁站监理开始时间：9:10	旁站监理结束时间：15:10
施工情况： 1、浇筑施工人员 6 人，铁锹 4 把，振动泵 2 个。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35，40m³。  	
监理情况： 监理对浇筑时进行旁站，要求使用振动泵，防止出现蜂窝麻面。做好成品桩的养护工作。	
处理意见： 现场已落实到位，未发现异常情况。	
备注：	
项目部： <u>湛江聚能</u> 质检员： <u>张华</u> 2020 年 04 月 28 日	项目监理部： <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员： <u>2020 年 4 月 28 日</u> 2020 年 04 月 28 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份



扫描全能王 创建
