

旁站记录表

工程名称: 联宝合肥电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JLPZ-003

日期及气候: 2019 年 10 月 12 日 晴

施工地点: 联宝厂区仓库


旁站监理的部位或工序: 夹具、导轨安装

旁站监理开始时间: 9:30

旁站监理结束时间: 12:30

施工情况:

施工人员 15 人, 管理人员 2 人, 6#仓库屋面夹具、导轨安装

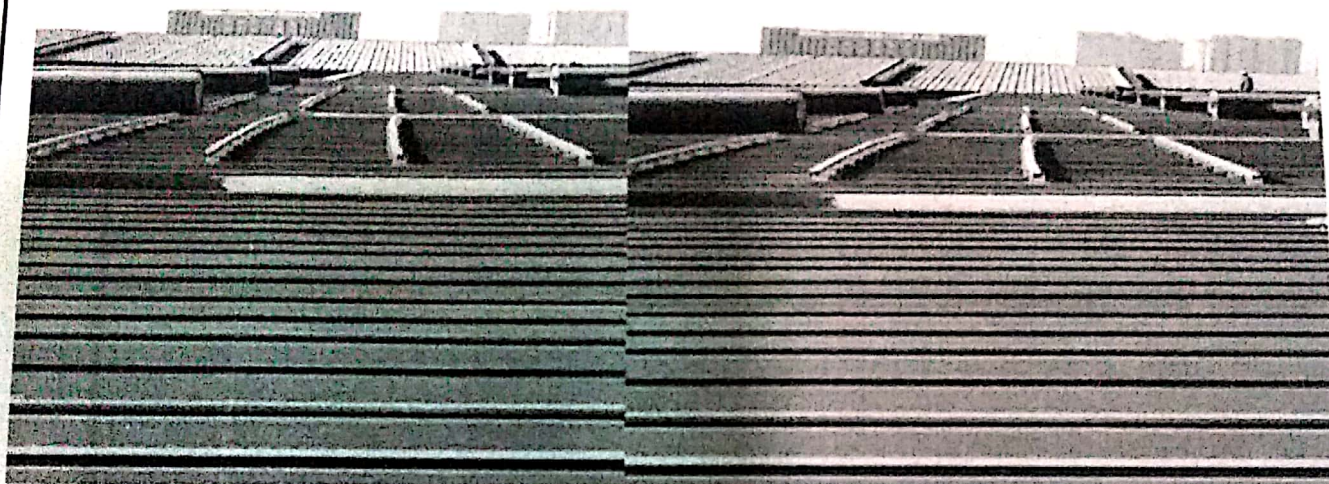

监理情况:

- 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。
- 2、测量现场部分导轨安装不符合设计要求。
- 3、抽查现场部分夹具安装不符合要求。
- 4、要求现场施工人员注意安全,不得违规操作,施工人员必须带安全帽。

发现问题: 抽查测量现场部分夹具导轨安装不符合设计要求

处理意见: 对于不符合要求的要求施工方立刻整改

备注 (包括处理结果): 整改完成报监理验收合格后可进行下一步工序

承包单位: 安徽臻杰建设工程有限公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员: 程建辉

旁站监理人员: 何柏林

日期: 2019 年 10 月 12 日

日期: 2019 年 10 月 12 日



扫描全能王 创建
