


旁站记录表

工程名称: 联宝合肥电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JLPZ-004

日期及气候: 2019 年 11 月 12 日 晴	施工地点: 联宝厂区仓库
旁站监理的部位或工序: 夹具、导轨安装	
旁站监理开始时间: 9:30	旁站监理结束时间: 12:30
施工情况: 施工人员 15 人, 管理人员 2 人, 6#仓库屋面夹具、导轨安装 	
监理情况: 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。 2、测量现场部分导轨安装不符合设计要求。 3、抽查现场部分夹具安装不符合要求。 4、要求现场施工人员注意安全,不得违规操作,施工人员必须带安全帽。	
发现问题: 抽查测量现场部分夹具导轨安装不符合设计要求	
处理意见: 对于不符合要求的要求施工方立刻整改	
备注 (包括处理结果): 整改完成报监理验收合格后可进行下一步工序	
承包单位: 安徽慧天新能源有限公司 质 检 员: <u>程建峰</u> 日 期: 2019 年 11 月 12 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>何柏林</u> 日 期: 2019 年 11 月 12 日

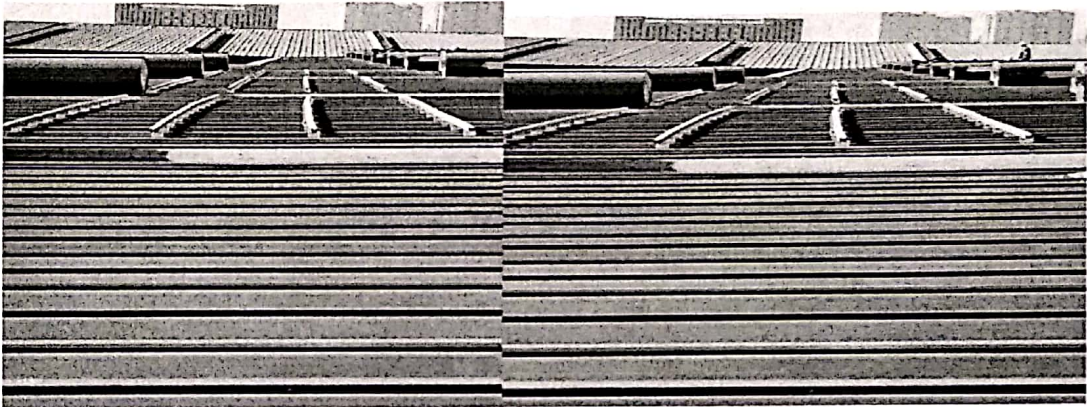

扫描全能王 创建
