


旁站记录表

工程名称：联宝合肥电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JLPZ-012

日期及气候：2020 年 05 月 31 日 阴	施工地点：联宝厂区 2#仓库屋面
旁站监理的部位或工序：光伏组件安装	
旁站监理开始时间：07:30	旁站监理结束时间：10:30
施工情况： 施工人员 15 人，管理人员 2 人，2#仓库屋面组件安装	
	
监理情况： 1、施工人员到岗，施工准备工作到位。 2、测量现场部分相邻组件高差不符合设计要求。 3、组件的压块螺栓个别位置不正。 4、要求现场施工人员注意安全，不得违规操作，施工人员必须带安全帽。	
发现问题：个别组件高低差超出范围，压块螺栓要紧固到位。	
处理意见：对于不符合要求的要求施工方立刻整改。	
备注（包括处理结果）：整改完成报监理验收合格后可进行下一步工序	
承包单位：安徽慧天新能源有限公司 质 检 员：程建辉 日 期：2020 年 5 月 31 日	项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：房立华 日 期：2020 年 05 月 31 日

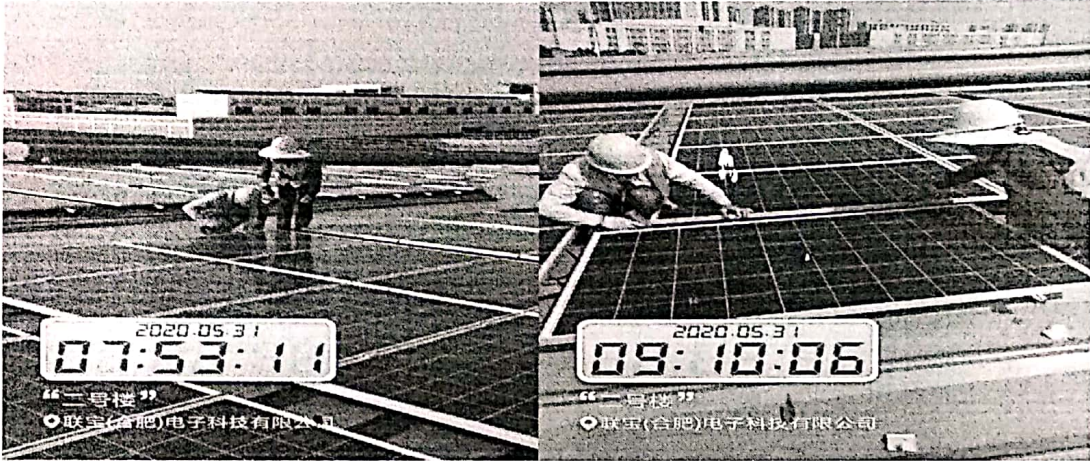

扫描全能王 创建
