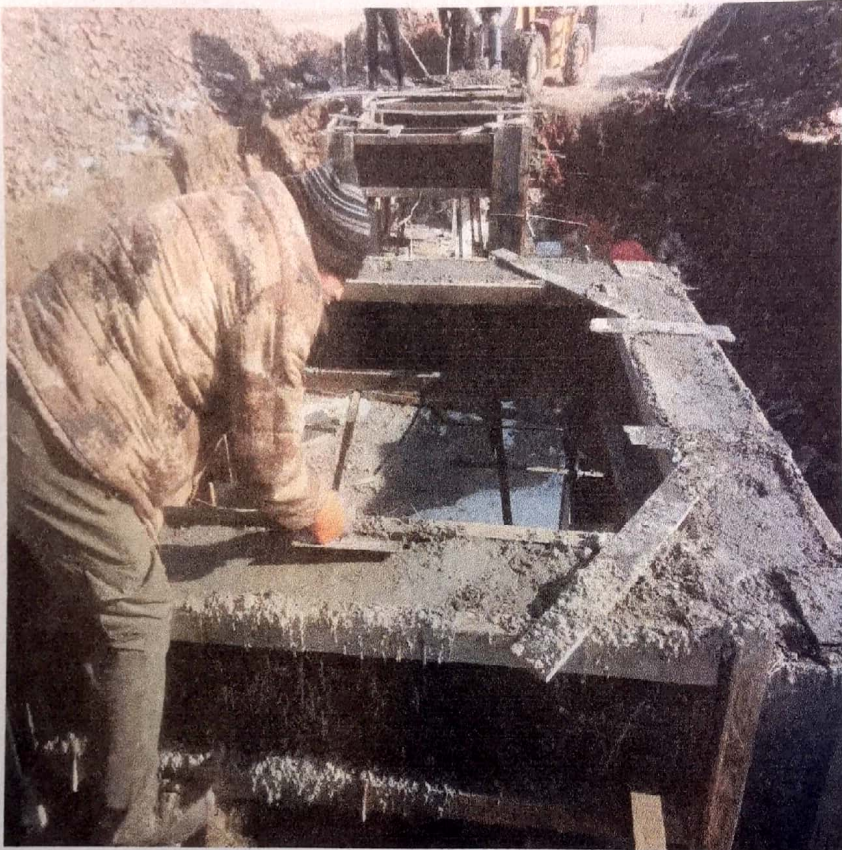


旁站监理记录表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MW 光伏并网发电项目

日期及天气：2019 年 11 月 15 日 晴 -2—-13℃	施工单位：环联巨能电力工程设计有限公司
旁站监理的部位或工序：10、11 区箱逆变基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：15：20	旁站监理结束时间：16：10
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 5 人，振捣器 1 台，发电机 1 台、商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30。	
	
发现的问题及处理情况： 问题：施工人员未佩戴安全帽，个别部位振捣不到位 处理情况：要求施工人员进行佩戴，重新进行振捣	
旁站监理人员（签字）： 张立 2019 年 11 月 15 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。
