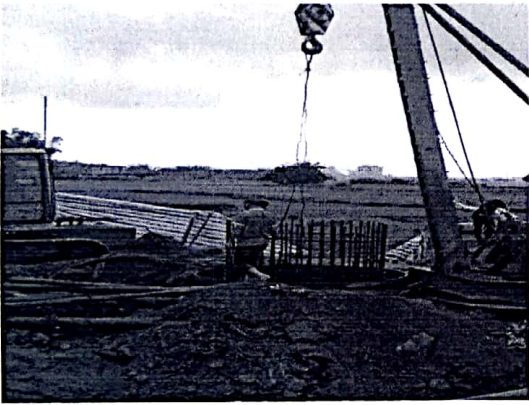
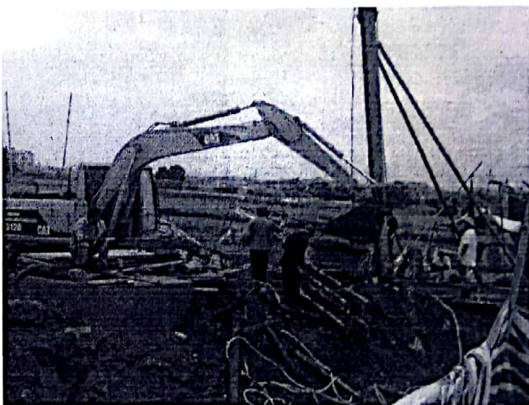


旁站监理记录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-048

日期及气候：2020.09.05. 多云. 25-35℃	工程地点：10#塔基
旁站监理的部位或工序：10#塔基 A 腿混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：14:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 3、采用钦州北部湾混凝土有限公司 C₂₅ 砼混。 4、6 人施工，木工一名，钢筋工四名。 5、振捣棒一个。 6、现场设备配备齐全。  	
监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全质量交底。 3、检查机械运转情况。 4、检查进场混凝土强度等级：C₂₅ 砼混。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：天津电建新能源建设有限公司	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员： <u>邓海龙</u>	旁站监理人员： <u>李健</u>
日 期：2020 年 09 月 06 日	日 期：2020 年 09 月 06 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建
