
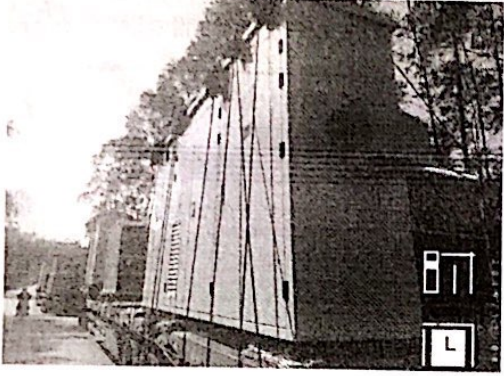


旁站监理记录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目 编号：ZHJL-PZJL-005

日期及气候：2019年12月08日	工程地点：料场
旁站监理的部位或工序：料场箱变卸货	
旁站监理开始时间：09:30	旁站监理结束时间：10:30
施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 3、采用奥克斯 S11-3150/37/0.8 双绕组变压器 4、8人施工，操作员一名，验货员一名，操作工六名。 5、货车三辆，吊车一台。 6、现场卸货设备配备齐全。	
 	
监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查机械运转正常。 4、材料型号：奥克斯 S11-3150/37/0.8 双绕组变压器	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：四川宝能电力设计有限公司	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员： <u>张 坤</u>	旁站监理人员： <u>费 宝 兴</u>
日 期：2019年12月8日	日 期：2019年12月8日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。

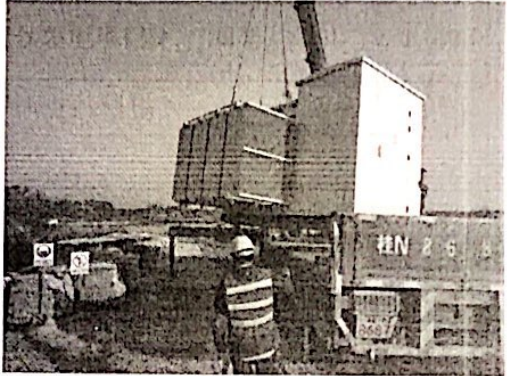
