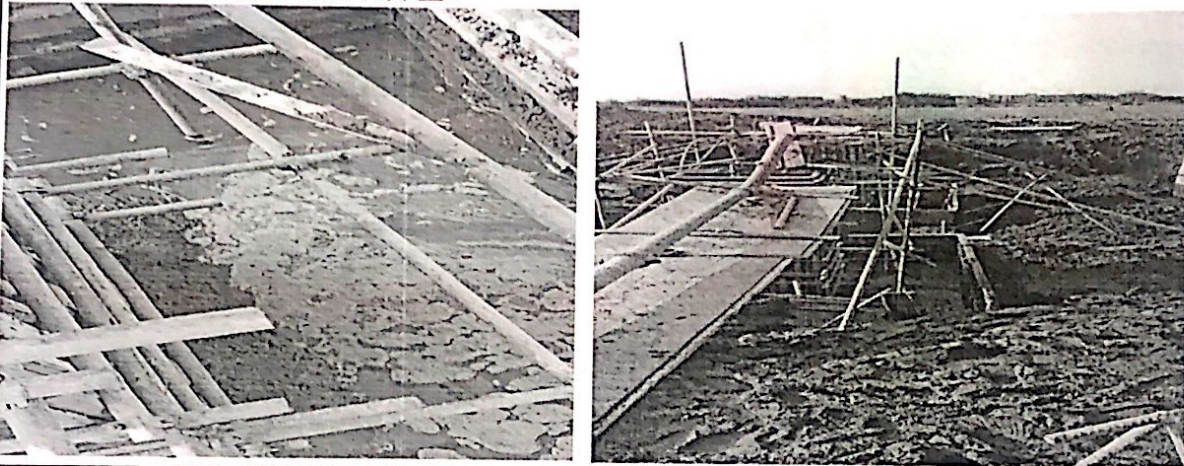


旁站监理记录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-031

日期及气候：2020 年 04 月 12 日	工程地点：12#塔基
旁站监理的部位或工序：12#塔基 A、D 腿混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：13:30	旁站监理结束时间：19:00
施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 3、采用钦州北部湾混凝土有限公司 C₂₅ 砼混。 4、8 人施工，木工三名，钢筋工五名。 5、振捣棒两个。 6、现场设备配备齐全。	
	
监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查机械运转正常。 4、材料型号：C₂₅ 砼混。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：天津电建新能源建设有限公司	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员：邓海龙	旁站监理人员：[Signature]
日 期：2020 年 4 月 13 日	日 期：2020 年 04 月 13 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建
