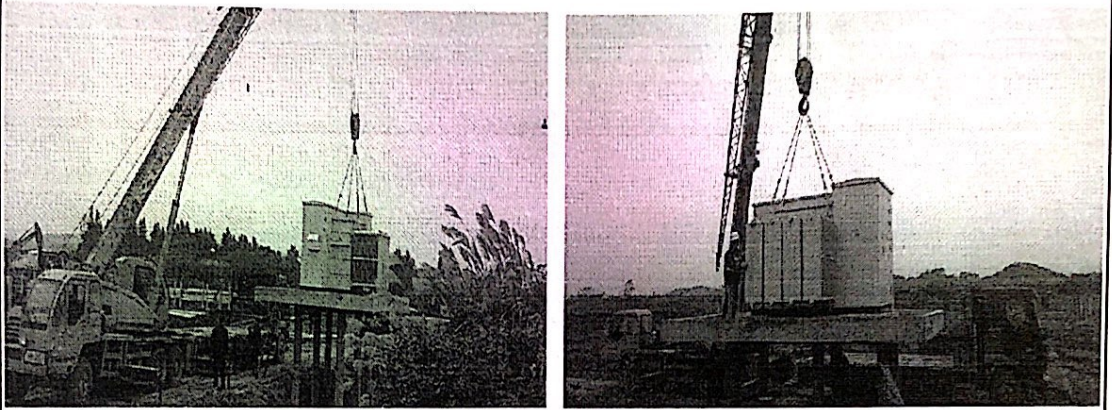


旁站监理记录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-025

日期及气候：2019 年 12 月 28 日	工程地点：27#、28#、26#箱变基础吊装
旁站监理的部位或工序：27#、28#、26#箱变基础吊装	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：12:00
施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 4、5 人施工，操作员一名，吊车一台，卡车一辆， 5、现场设备配备齐全。	
	
监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查机械运转正常。	
发现问题：现场吊装人员未佩戴安全帽，存在安全隐患；	
处理意见：要求现场整改，整改完后方可进行吊装；	
备 注：	
施工项目部：四川宝能电力工程设计有限公司 质 检 员：张敏 日 期：2019年12月28日	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：黄宝光 日 期：2019年12月28日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建
