


旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-009

日期及气候: 2019 年 12 月 24 日 多云转阴	施工地点: 升压站 GIS 基础、主变基础
旁站监理的部位或工序: 升压站主变、GIS	
旁站监理开始时间: 13:30	旁站监理结束时间: 15:00
施工情况: 商品砼 C30。施工人员 10 人, 泵车一辆, 振动棒 2 台, 管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好;  	
监理情况: 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。 2 测量钢筋尺寸,符合设计图纸要求。 3、要求现场施工人员注意安全,不得违规操作。 4、要求浇筑时及时振捣到位,要求浇筑完毕后收面。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无。	
承包单位: 森源电气股份有限公司 技 术 员: 王秀宾 日 期: 2019 年 12 月 24 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 董宇明 日 期: 2019 年 12 月 24 日

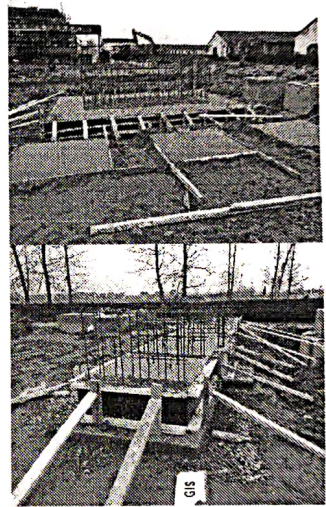

扫描全能王 创建
