

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-013

日期及气候: 2020 年 1 月 12 日 霾转多云



施工地点: 升压站消防泵房

旁站监理的部位或工序: 消防泵房浇筑

旁站监理开始时间: 9:30

旁站监理结束时间: 18:00

施工情况: 商品砼 C30。施工人员 10 人, 泵车一辆, 振动棒 2 台, 管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好;

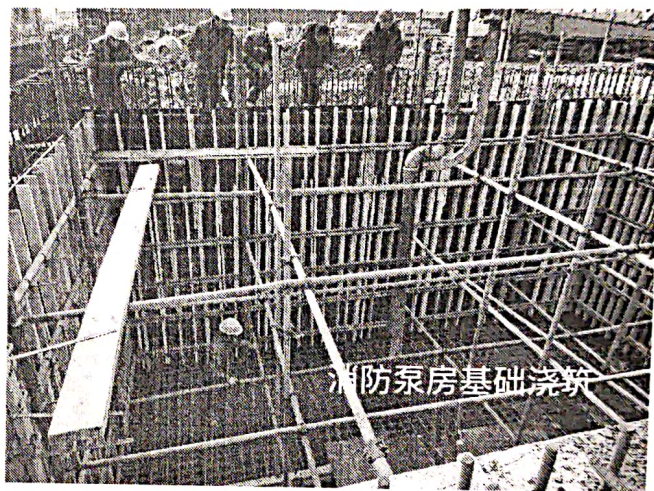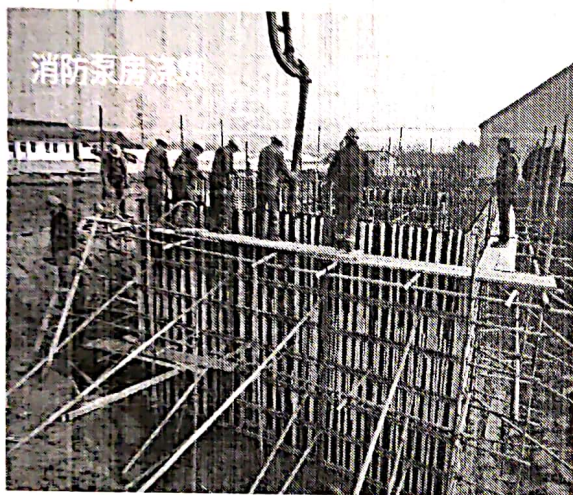

监理情况:

- 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。
- 2、要求现场施工人员注意安全,不得违规操作。
- 3、要求浇筑时及时振捣到位,要求浇筑完毕后收面。
- 4、测量绑筋规格,符合图纸要求

发现问题: 无

处理意见: 无

备注 (包括处理结果): 无。

承包单位: 森源电气股份有限公司

技术 员: 王秀兵

日 期: 2020 年 1 月 12 日

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 魏树斌

日 期: 2020 年 1 月 12 日



扫描全能王 创建
