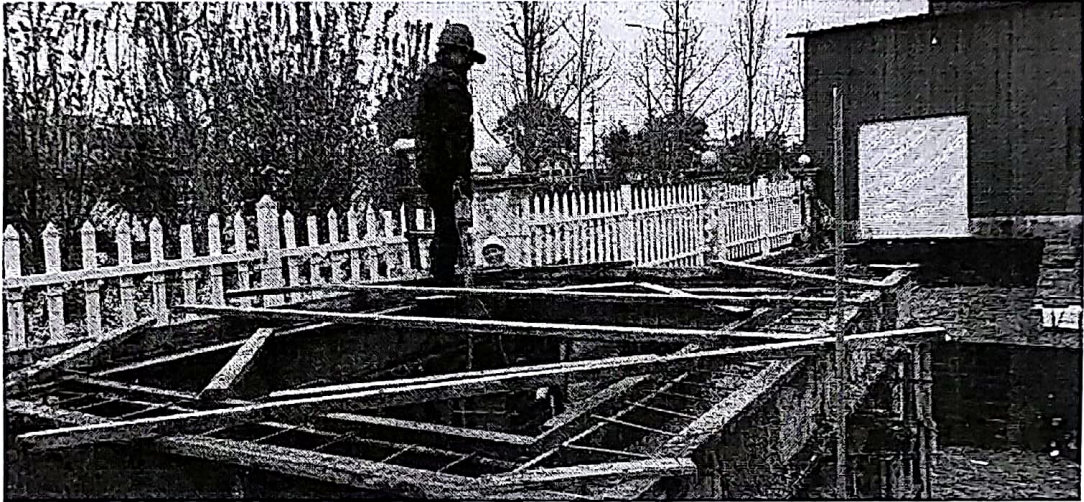



旁站监理记录表

工程名称：江苏大丰德和绝热 2.72304MW 光伏发电项目

编号：PZJL-01

日期及天气：2020 年 03 月 27 日 晴 4-16℃	施工单位：江苏中天科技工程有限公司
旁站监理的部位或工序：升压室、SVG 室基础浇筑	
旁站监理开始时间：06:30	旁站监理结束时间：9:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 5 人，振动器 1 台，商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，5m³。 	
发现的问题及处理情况： 问题：部分表面抹面不平。 处理情况：施工人员重新修整。	
旁站监理人员（签字）：  2020 年 3 月 27 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。
