

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：



JXM9-JL01-025

日期及气候：2020.05.05 阴 19~26℃	施工地点：升压站
旁站监理的部位或工序：35KV 预制舱接地	
旁站监理开始时间：2020.05.05 8:00	旁站监理结束时间：2020.05.05 18:00
施工情况： 1、施工人员：3 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、安全员到场，安全员进行班前喊话和风险评估； 3、焊工持证上岗； 4、投入设备：折弯机、打孔机、焊机一台，防护用具等用品。	
监理情况： 1、采用双接地，两条引线分别与接地网不同接地干线链接； 2、水平接地采用 60*8mm 热镀锌扁钢，深埋为 0.8m，垂直接地体采用 ϕ 50mm 镀锌钢管； 3、接地干线交叉处应焊接，焊接长度不小于镀锌扁钢长度的两倍，三面施焊，镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的 6 倍并应双面施焊； 4、焊接完成后处理焊渣并涂刷防腐。	
发现问题：1. 检查发现接地长度小于规范要求两倍，2. 焊缝不饱满。	
处理意见：要求现场负责人员针对以上问题立即整改。	
备注（包括处理结果）：现场监督整改完成	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王孝金 日期：2020年05月05日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存



由 扫描全能王 扫描创建

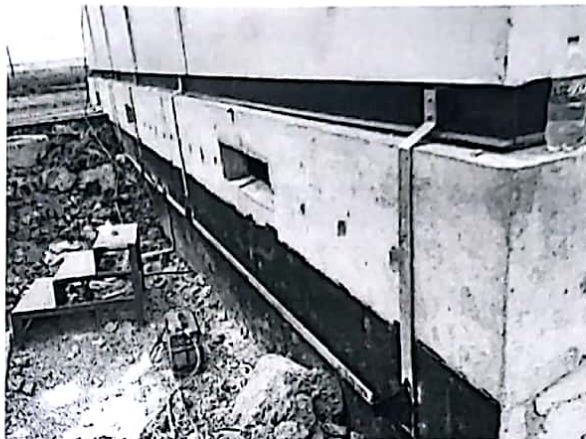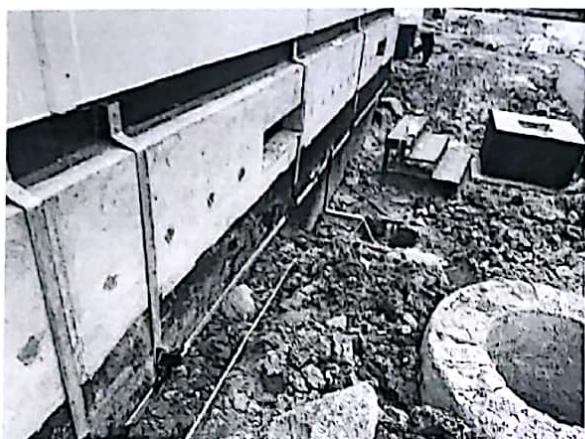

69



由 扫描全能王 扫描创建
