

旁站监理记录表

工程名称: 湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号:

JXM9-JL01-041


日期及气候: 2020.05.22 晴 20℃-30℃	施工地点: 升压站
旁站监理的部位和工序: 110KV 高压线引入升压站龙门构架 紧线	
旁站监理开始时间: 2020.05.22 08:00	旁站监理结束时间: 2020.05.23 10:00
施工情况: 1、施工单位 10 名施工人员, 1 名专职安全员, 1 名项目现场负责人; 2、工器具配备齐全, 合格, 安全防护用品佩戴正确, 安全员到位; 3、紧线前收紧余线, 在紧线端夹上卡线器; 4、紧线时, 一边牵引导线观测弧垂, 待导线弧垂接近规定要求时, 指挥人员通知牵引设备的操作人员缓慢牵引收紧导线同时观测弧垂。 5、施工过程合理有序, 顺利完成。 附件: 图 1 图 2	
监理情况: 1. 旁站监理 1 人, 施工前检查施工单位工器具和材料准备情况, 符合要求; 2. 检查施工人员配置符合事前安排, 满足要求; 3. 严格安全检查、交底; 督促严格规范施工及自检;	
发现问题: 1. 施工中龙门构架有施工人员进行走动; 2. 没有防暑降温的冰水或冷饮;	
处理意见: 要求专职安全员, 要把现场安全, 做好安全文明施工。	
备注 (包括处理结果): 现场已按要求执行, 落实到位。	
项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 秦帮学 日期: 2020年 05月 22日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存档





(图 1)

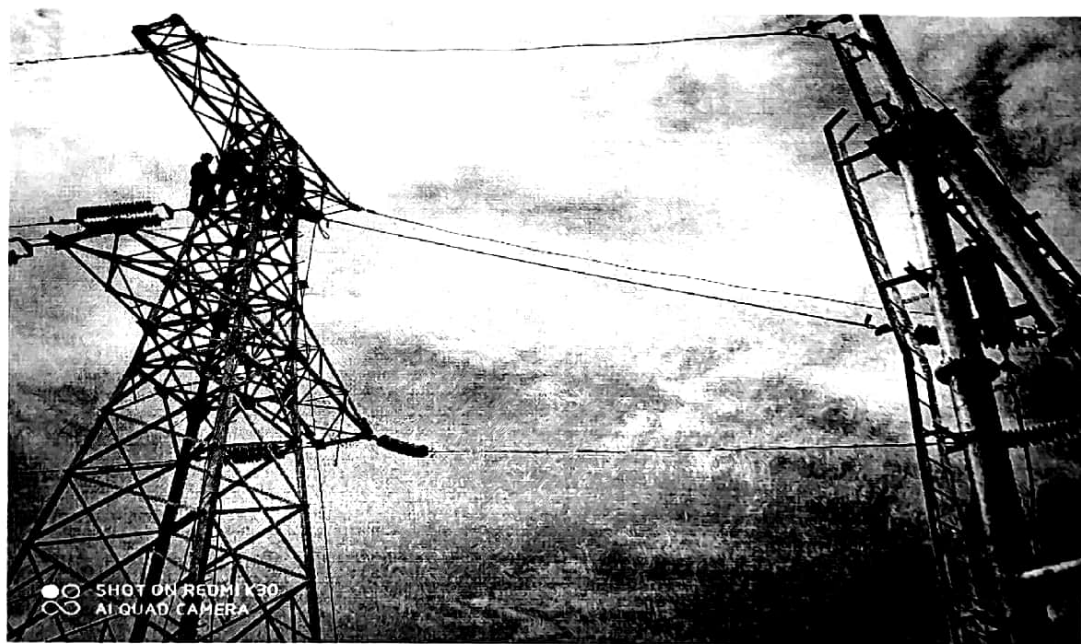

(图 2)

80



由 扫描全能王 扫描创建
