

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：

JXM9-JL01-052



日期及气候：2020.6.27 多云 26~31℃	施工地点：光伏区
旁站监理的部位或工序：光伏 T12 区防雷接地焊接	
旁站监理开始时间：2020.6.27 14:30	旁站监理结束时间：2020.6.27 17:00
施工情况： 1、施工人员：3 人，上岗前经过培训和技术交底； 2、投入设备：发电机，焊机一台，脚手架，防护用具等用品。	
监理情况： 1、Φ50mm 镀锌钢管入土 2.5m 为接地体； 2、Φ16mm 镀锌圆钢搭接立柱和圆钢接地体，搭接长度≥96mm； 3、焊接时双面焊接，现场要求焊缝饱满，不得有虚焊脱焊等现象，不得残留焊渣； 4、接地圆钢走线美观，沿管桩桩壁下沿链接接地体；	
发现问题： 1. 接地体入地面困难，打击力度不够。 2. 桥架接地网未固定。	
处理意见： 1. 更换施工工具，增加锤击力度。 2. 接地与支架固定。	
备注（包括处理结果）： 测试接地电阻是否满足图纸要求，接地圆钢尽快与支架固定。	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张忠忠 日期：2020 年 6 月 27 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存

101



由 扫描全能王 扫描创建

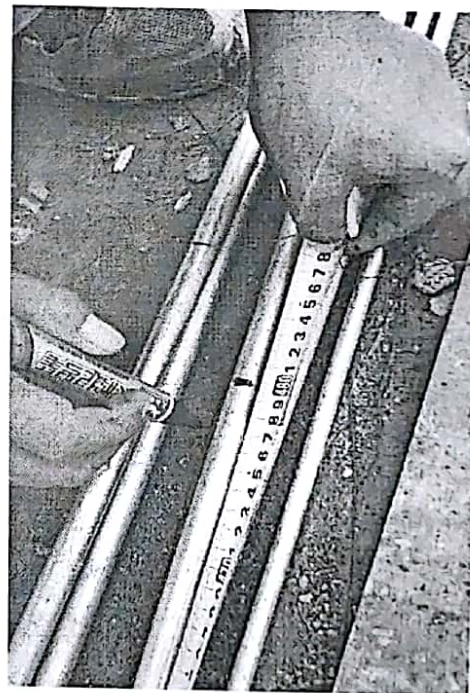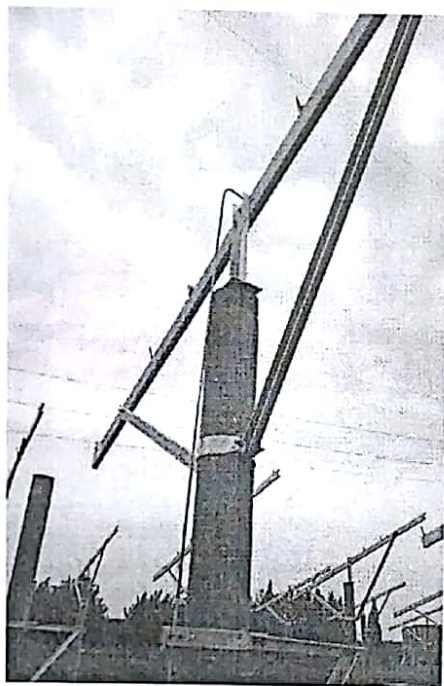

102

