

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：

JXM9-JL01-053


日期及气候：2020.07.15 阴 24℃-26℃	施工地点： 升压站
旁站监理的部位或工序：护坡坡面浇筑浇筑	
旁站监理开始时间：2020.07.15 13:40	旁站监理结束时间：2020.07.15 17:50
施工情况： 1、施工人员 5 人，质检员进行施工前技术交底 2、砼为自拌混凝土 c30，人工连续浇筑； 3、安全员到岗检查安全措施落实； 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、设备投入：铲车一辆、50 震动棒一台及其它小型辅助工具。 6、浇筑顺序及方法：无纺布铺设→布料→振实→平整→压实→压光→养护； 7、浇筑时，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时，移位。	
监理情况： 1、浇筑申请已批复。使用自拌混凝土 c30； 2、现场检查塌落度实测值为 183mm； 3、检查坡面坡度符合要求； 4、检查坡面模板厚度，符合要求； 5、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆； 6、浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测。	
发现问题： 地基没有夯实角度小于要求	
处理意见： 要求夯实基础调整角度。	
备注（包括处理结果）：	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张海龙 日期：2020 年 7 月 15 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存

103



由 扫描全能王 扫描创建

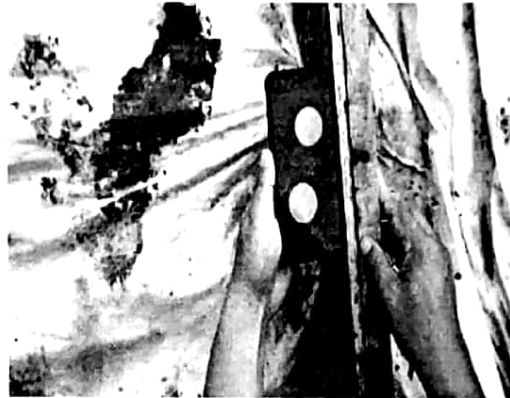

100



由 扫描全能王 扫描创建
