

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：

JXM9-JL01-059

日期及气候：2020.08.05 晴 29℃-36℃	施工地点：光伏区
旁站监理的部位或工序：光伏区 T16、T17、T18、T19 区箱变耐压检测	
旁站监理开始时间：6:20	旁站监理结束时间：9:46
施工（试验）情况： 1、测试现场：调试单位技术负责人、操作人员、施工单位技术人员，测试人员共 2 人； 2、主要测试仪器采用 GYD-10 电源箱及升压设备，其它辅助设备齐全； 3、测试人员穿戴好防护用具，现场测试区域拉好防护网； 4、测试过程按照 35KV 箱变测试方案实施； 5、测试的耐压等级按技术标准执行； 见附件 图 1 图 2 图 3 图 4	
监理情况： 1、测试前测试区域拉好防护网，测试区域定人守护； 2、测试仪器放置到位，辅助工具准备齐全； 3、测试仪器有检验合格证，功能符合测试要求； 4、监视试验电压，电压缓慢上升直至 68KV，保持 1min； 5、试验过程测试技术负责人现场监督，测试负责人和厂家技术人员现场联络，未发生异常现象；	
发现问题： 天气炎热，现场人员未见饮用水	
处理意见： 要求高温天气配必要的防暑降温冷饮水	
备注（包括处理结果）： 施工单位已按要求执行	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：秦辉文 日期：2020年08月05日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存档



由 扫描全能王 扫描创建

附件:



图 1

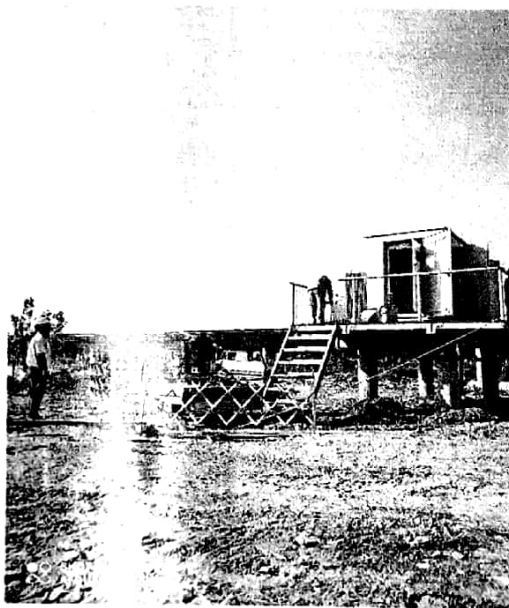


图 2



图 3

