

# 旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目


编号：JXM9-JL01-074

日期及气候: 2020.08.14 晴 26°C-34°C	施工地点: 光伏区 T6 箱变
旁站监理的部位或工序: 高压电缆头制作	
旁站监理开始时间: 2020.08.14 9:30	旁站监理结束时间: 2020.08.14 11:00
<p>施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>施工作业指导书是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>向操作人员进行了技术交底。</li><li>施工管理人员 1 人、安装人员 4 人, 是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>均到岗。设备、材料是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已落实到位。</li><li>电缆型号, 电压等级及规格是<input checked="" type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>符合设计, 绝缘是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>良好。</li></ol> <p>电缆终端及配件是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>齐全, 无损伤。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>施工制作工艺是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合规程及产品技术要求。</li><li>接地线连接安装是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>可靠。</li><li>接线端子压接是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>可靠。</li><li>相色标志是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>正确。</li></ol>	
<p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>施工前检查施工单位的安全措施, 符合要求;</li><li>旁站监理 1 人, 施工前检查施工单位设备、工具、材料等准备情况;</li><li>检查操作人员配备符合事前安排, 满足要求;</li><li>检查液压钳、铜铝过渡鼻子、3M 管、热缩管、缠绕带等工具、材料合格证明;</li><li>电缆型号为 ZC-YJLY23-26/35KV 规格为 <math>3 \times 400\text{mm}^2</math>;</li><li>施工顺序如下: 剥电缆铠甲, 打卡子 → 压接地线 → 包缠电缆 → 三相铜屏蔽层绕包编织线并用恒力弹簧卡紧 → 包缠电缆 → 套 → 冷缩 3M 套 → 套冷缩绝缘管 → 量好尺寸剥切绝缘和铜屏蔽层 → 打磨清理后涂一层硅脂套上冷缩终端 → 压上接线端子套冷缩密封管 → 缠绕相位带安装完毕。</li><li>检查电缆头制作质量, 符合要求;</li></ol>	
发现问题: <u>施工结束后现场垃圾未及时清理。</u>	
处理意见: <u>告知负责人并派人清理</u>	
备注(包括处理结果): <u>已清理</u>	
项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司	
旁站监理人员: <u>王孝金</u>	
日期: 2020 年 8 月 10 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存档。



由 扫描全能王 扫描创建

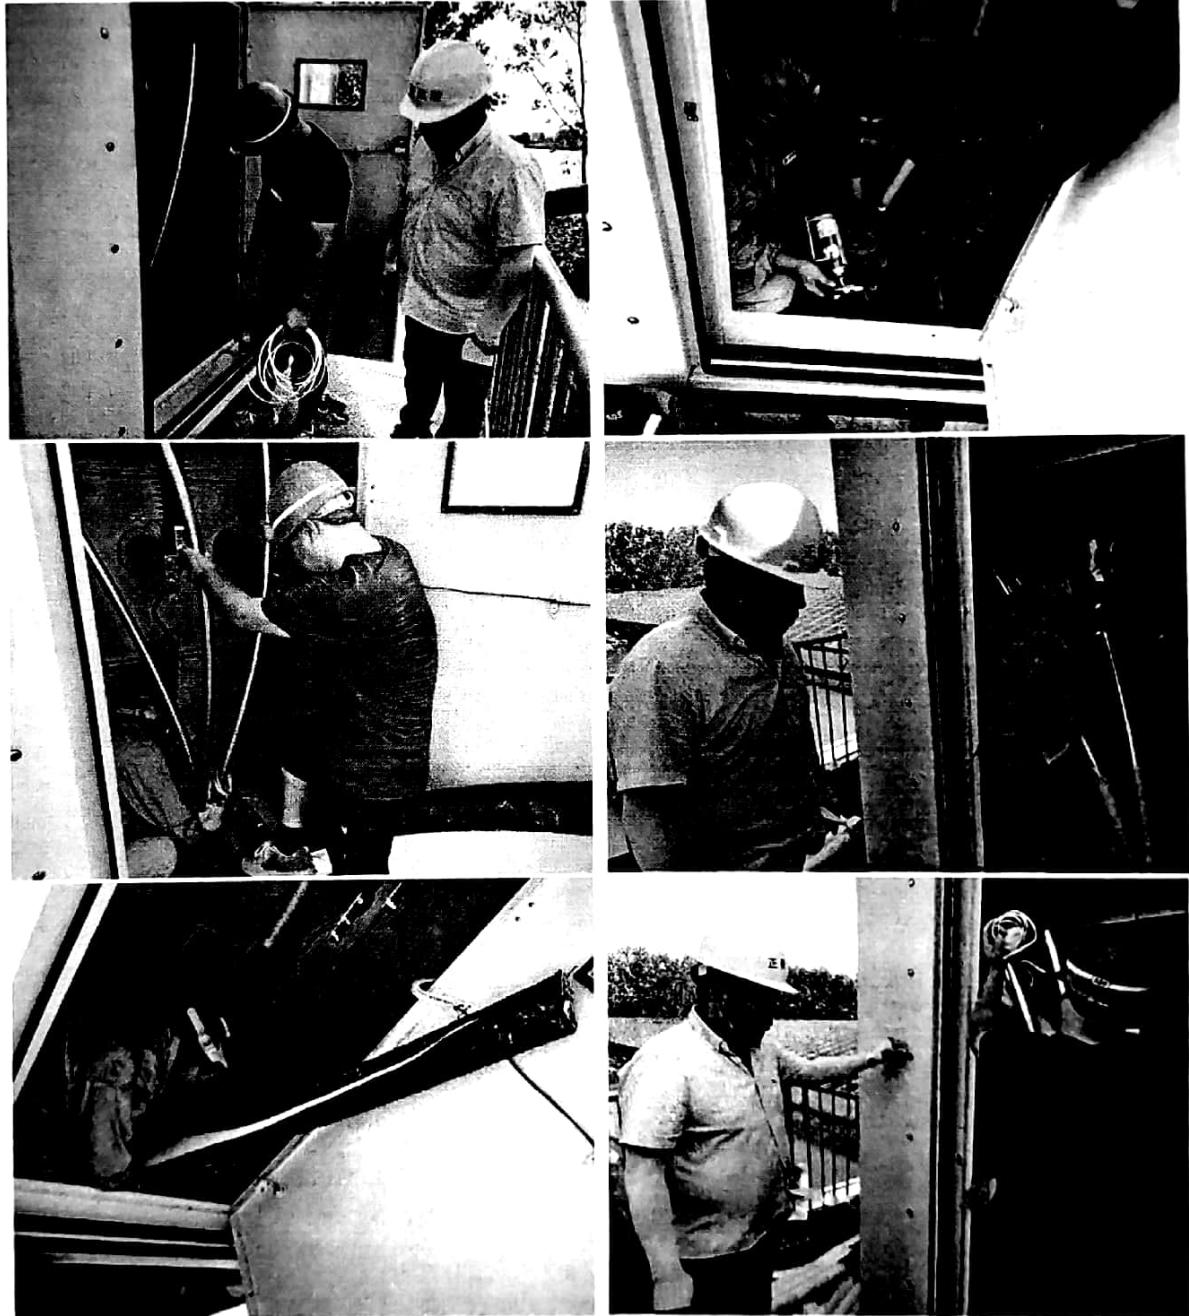

由 扫描全能王 扫描创建
