

# 旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：



JXM9-JL01-026

日期及气候: 2020.04.15 晴 17°C-27°C	施工地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 二次预制舱基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2020.04.15 7:20	旁站监理结束时间: 2020.04.15 12:00
<p>施工情况:</p> <p>1、施工人员 18 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、砼为商品混凝土 C30，泵车连续浇筑； 3、安全员进行班前安全交底； 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、设备投入：水泥罐车一辆、泵车一辆、50 震动棒两台及其它小型辅助工具。 6、浇筑顺序及方法：布料→振实→平整→压实→压光→养护； 7、浇筑时，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时，移位。</p>	
<p>监理情况:</p> <p>1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 C30； 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3、现场检查塌落度实测值为 180mm； 4、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆 5、浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测；</p>	
发现问题: <u>钢筋保护层不足</u>	
处理意见: <u>次浇筑完后钢筋保护层</u>	
备注（包括处理结果）: <u>已整改</u>	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司	
旁站监理人员: <u>何永</u>	
日期: 2020年04月15日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存



扫描全能王 创建

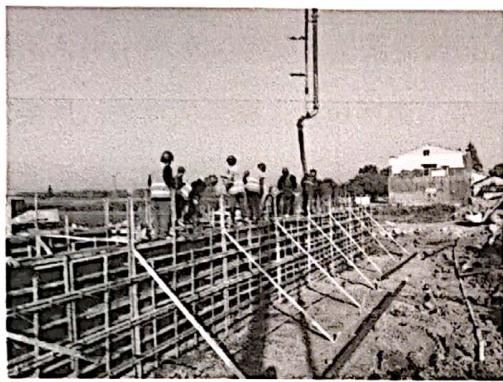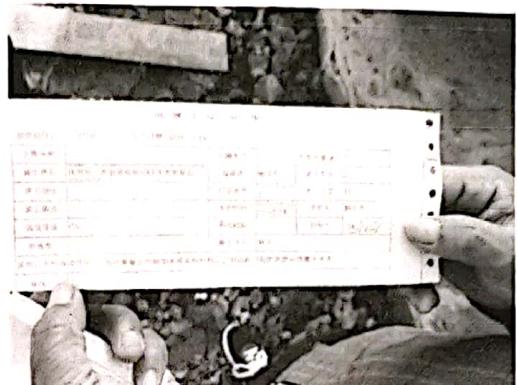

1. 本工程由我公司承建，施工过程中严格按照国家相关规范和标准进行施工。  
2. 施工过程中，我们严格控制施工质量，确保每一道工序都符合设计要求。  
3. 我们配备了专业的施工队伍，拥有丰富的施工经验，能够保证施工进度。  
4. 在施工过程中，我们将注重环境保护，减少对周围环境的影响。  
5. 我们将定期对施工进度和质量进行检查，确保工程顺利进行。  
6. 在施工过程中，我们将注重施工安全，确保施工人员的安全。  
7. 我们将努力完成工程，为客户提供优质的服务。



扫描全能王 创建
