

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：


JXM9-JL01-051

日期及气候：2020.05.18 多云转晴 18℃-29℃	施工地点： 升压站
旁站监理的部位或工序：避雷针、围墙基础浇筑	
旁站监理开始时间：2020.05.18 17:30	旁站监理结束时间：2020.05.18 19:30
施工情况： 1、施工人员 8 人，质检员进行施工前技术交底； 2、砼为商品混凝土 c30，人工连续浇筑； 3、安全员到岗检查安全措施落实； 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、设备投入：混凝土泵车、50 震动棒一台及其它小型辅助工具。 6、浇筑顺序及方法：布料→振实→平整→压实→压光→养护； 7、浇筑时，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时，移位。	
监理情况： 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30； 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3、现场检查塌落度实测值为 180mm； 4、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆； 5、浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测。	
发现问题： 个别钢筋间距不规矩。	
处理意见： 现场及时调整钢筋间距。	
备注（包括处理结果）： 已整改	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 何如 日期： 2020 年 05 月 18 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存



扫描全能王 创建

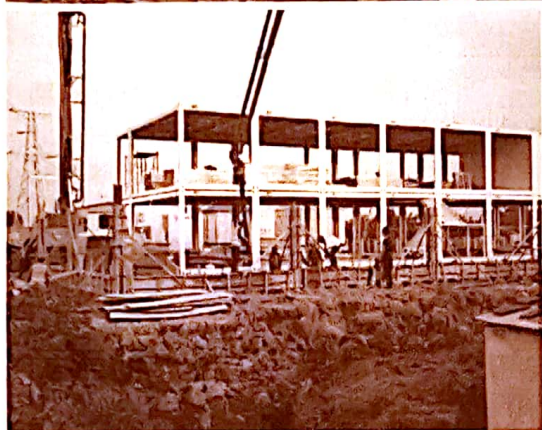

扫描全能王 创建
