

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-007

日期及气候：2020.01.03 阴 11℃-4℃	施工地点：11 号铁塔
旁站监理的部位或工序：11 号铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间：2020.01.03 10:17	旁站监理结束时间：2020.01.03 18:00
施工情况： 1、施工人员 8 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、砼为商品混凝土 c30，泵车连续浇筑； 3、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估。 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、设备投入：水泥罐车一辆、钻机一台、铲车一辆及其它小型辅助工具。	
监理情况： 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30； 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3、现场检查塌落度实测值为 180mm； 4、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆 5、浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测； 6、留试块 1 组。	
发现问题：个别施工人员现场吸烟。	
处理意见：现场立即制止并要求施工单位加强现场管理。	
备注（包括处理结果）：已整改	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：信以正 日期：2020年01月03日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存_____



扫描全能王 创建



混凝土浇筑



下钢筋笼




钻机就位



泥浆循环



护筒埋设

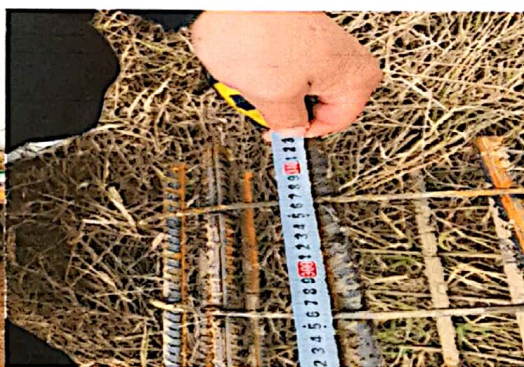

测量

