


旁站记录表

工程名称: 常州金坛贝特瑞 10.79MW 分布式光伏发电项目

编号: CZJTBTR-2-851-4-1-3

日期及气候: 2020 年 06 月 8 日 晴	施工地点: 施工现场
旁站监理的部位或工序: 1 号和 4 号预制舱基础底板钢筋浇筑	
旁站监理开始时间: 7:20	旁站监理结束时间: 10:10
施工情况: 混凝土车一台, 小型推土机。 施工人员 6 人, 管理人员 1 人, 施工设备到场情况良好。  	
监理情况: 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。 2、要求现场施工人员注意安全,不得违规操作。	
发现问题: 1 号预制舱基础承重梁的宽度少于 50cm, 主筋少 4 根。	
处理意见: 严格按图施工	
备注 (包括处理结果): 已整改到位	
承包单位: <u>天园电力</u> 质 检 员: <u>刘 森</u> 日 期: <u>2020 年 6 月 8 日</u>	项目监理单位: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员: <u>王 国 富</u> 日 期: <u>2020 年 6 月 8 日</u>

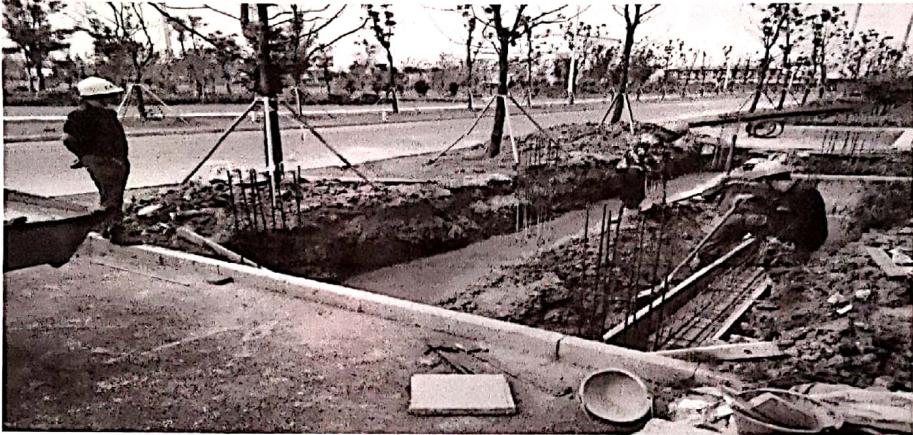

扫描全能王 创建
