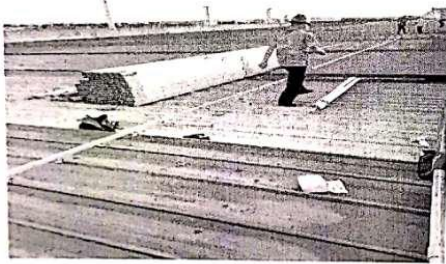


旁站监理记录表

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TLTPZ-002

日期及气候：2020.07.19 晴	工程地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 32 号厂房
旁站监理的部位或工序：屋面支架安装	
旁站监理开始时间：14:00	旁站监理结束时间：19:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工安装人员到达现场，工器具已准备。由施工领班进行安装交底，然后开始工作。将支架吊装到屋面上放在提前搭建好的卸货平台上，然后逐一分散施工点，将支架通过螺丝固定在夹具上，符合要求后，进行紧固。  监理情况： 现场监理人员要求安装人员做好安全防护，对夹具进行检查是否紧固到位，不合格的要求施工方进行调整，由于支架较长，要求 2 人一组左右配合进行安装。要求安装人员对支架夹具中的任意部位螺丝要紧固到位，已安装好的支架，要求施工单位质检人员进行检查，有松动的地方要及时调整紧固。经检查安装质量符合要求，基准点三方复检合格。 发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  2020 年 07 月 19 日	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
