

旁站记录

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-PZ-013




日期及气候： 2020 年 6 月 23 日，阴转晴， 13/25°	施工地点： 交口县水头镇
旁站监理的部位或工序： 南 76 区支架基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间： 下午 2:00	旁站监理结束时间： 下午 6:30
施工情况： - 南 76 区基础混凝土浇筑，强度等级 C30，下午 6 点 30 分完成浇筑。 - 采用商混凝土，， 施工管理人员及相关班组人员均到位。	
监理情况： - 施工单位现场人员，机械准备到位，施工机械良好。 - 机械设备安全防护设施到位。 - 整个浇筑过程进行全程旁站监理。 - 运输车 3 台，供料比较连续、及时。 - 满足设计和施工要求，砼试压件见证取样。 - 整个浇筑过程未出现异常，施工操作基本按相关规范要求施工。	
发现问题： 1、个别支架基础模具高度不符合要求。2、个别支架基础浇筑时，振捣不密实。	
处理意见： - 要求每个支架基础模具根据地面落差，在适当的范围内，调整模具长度。 - 每个基础浇筑时必须振捣密实。	
备注（包括处理结果）： 已按要求整改	
施工单位： 特变电工新疆新能源股份有限公司 质 检 员： 王海松 日 期： 2020.6.23	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 张金钊 日 期： 2020.6.23

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存_____份。



扫描全能王 创建

编号: SXLLJK-PZ-013

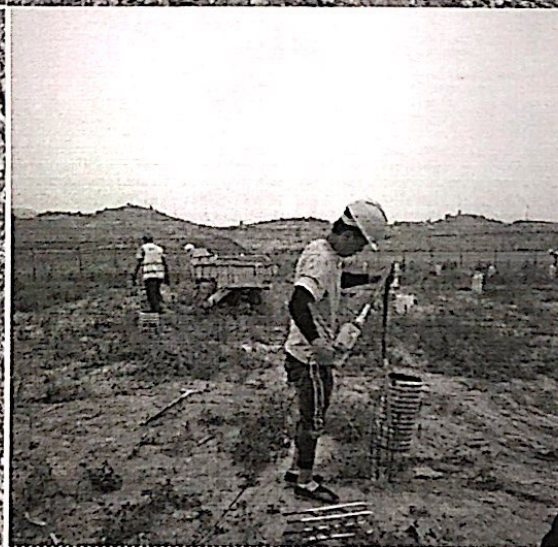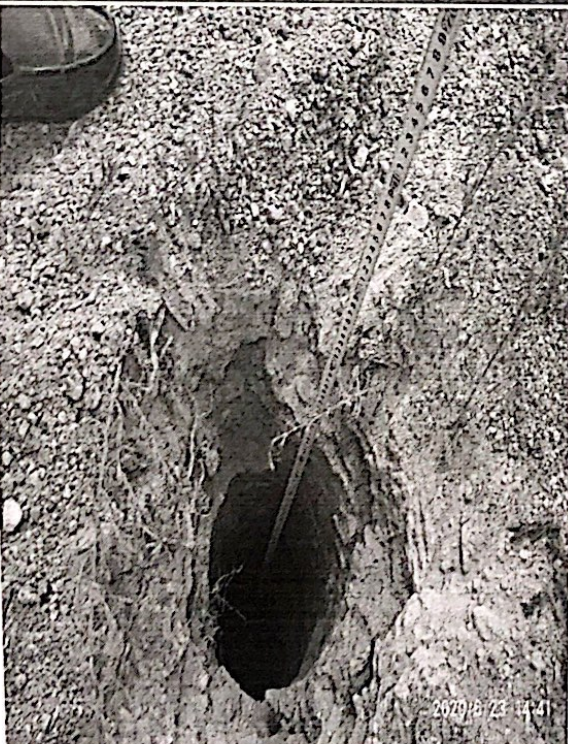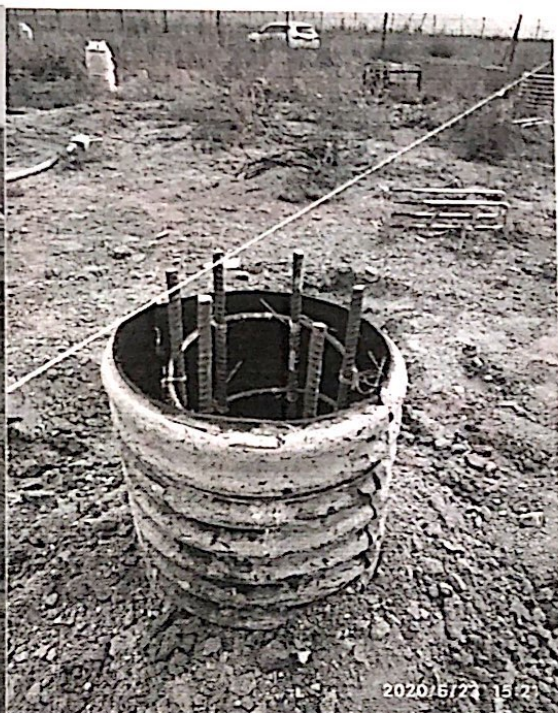

星期二

2020-06-23

31°

今日心情: ♥♥♥♥♥

南76区支架基础浇筑

山西省吕梁交口县



扫描全能王 创建
