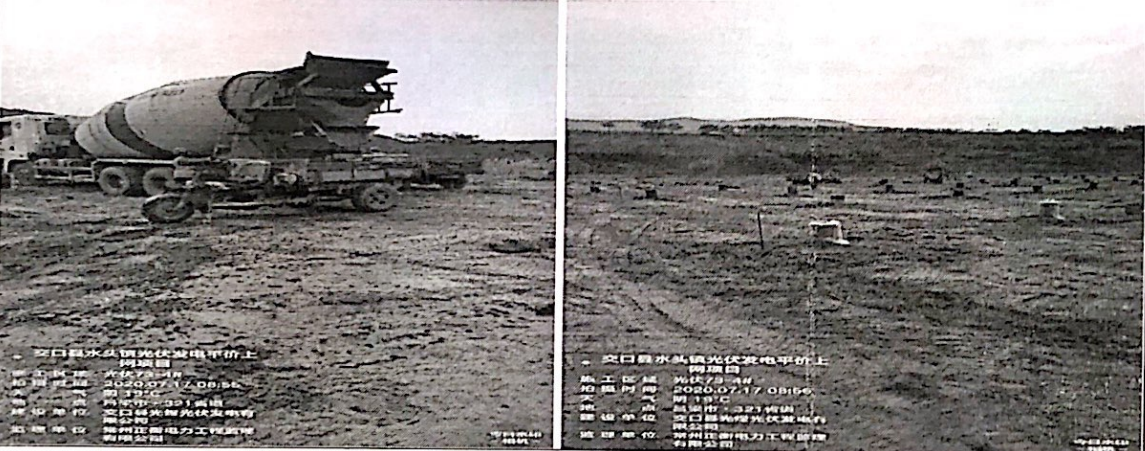


旁站监理记录

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-PZ-

日期及气候：2020 年 7 月 17 日	工程地点：73#方阵
旁站监理的部位或工序：73#方阵基础桩混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：8:45	旁站监理结束时间：11:50
施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 3、采用交口县晋申商砼有限公司 C₃₀ 砼混。 4、15 人施工，木工 5 名，钢筋工 8 名。 5、振捣棒两个。 6、现场设备配备齐全。	
	
监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查机械运转正常。 4、材料型号：C₃₀ 砼混。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工单位： 特变电工新疆新能源股份有限公司 质 检 员：徐新 日 期：2020.07.17	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张金贵 日 期：2020.07.17

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建
