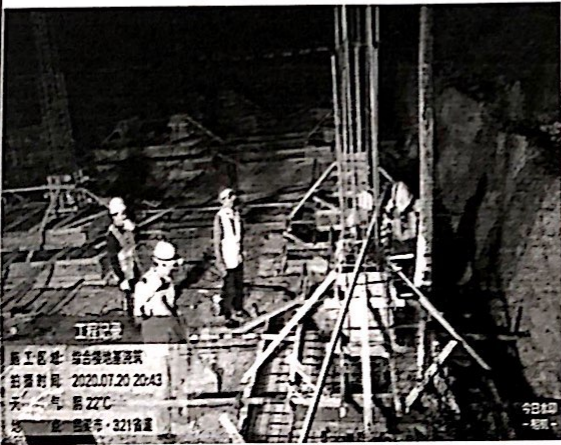


旁站监理记录

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-PZ-016

日期及气候: 2020 年 7 月 20 日		工程地点: 升压站综合楼	
旁站监理的部位或工序: 升压站综合楼基础混凝土浇筑			
旁站监理开始时间: 20:30		旁站监理结束时间: 24:30	
施工情况: 1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 3、采用交口县磊恒商品混凝土有限公司 C₃₀ 砼混。 4、20 人施工, 木工 8 名, 钢筋工 12 名。 5、振捣棒三个。 6、现场设备配备齐全。			
 工程名称: 升压站综合楼基础浇筑 拍摄时间: 2020.07.20 20:43 天气: 阴 22°C 地点: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目		 升压站综合楼基础浇筑 交口县水头镇光伏发电平价上网项目 施工区: 升压站 拍摄时间: 2020.07.20 21:05 天气: 阴 20°C 地点: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目	
监理情况: 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质, 均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查机械运转正常。 4、材料型号: C30 砼混。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备 注:			
施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质 检 员: 王海峰 日 期: 2020.7.20		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 时金宝 日 期: 2020.7.20	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建
