


崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-21

日期及气候		2020年08月04日	
施工地点		19#阵列	
旁站监理的部位或工序		管桩打桩	
旁站监理开始时间	07:00	旁站监理结束时间	17:30
施工情况: 400桩机2台 300桩机3台 场地平整, 施工单位质检员在旁.			
监理情况: 管桩规格符合设计要求, 质量证明文件齐全, 表面感官合格			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果): 无			
承包商:  质检员: 田建合 2020年8月4日		项目监理机构:  旁站监理人员: 周飞 2020年8月6日	

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录



NO: CZZH-7105-ZL-11

日期及气候		2020.08.06	
施工地点		23#方阵.	
旁站监理的部位或工序		预制管桩打桩	
旁站监理开始时间	2020.08.06 8时	旁站监理结束时间	2020.08.06. 17.30
施工情况: 300打桩机3台, 400打桩机2台, 场地平整较差. 施工点位质检员在岗. 管桩规格、质量符合设计要求			
监理情况: 监理对施工管桩进行检查, 表面感官质量符合要求.			
发现问题: 个别桩基垂直度偏差大于设计要求.			
处理意见: 要求施工点位安排机械对不符合要求的管桩进行整改.			
备注(包括处理结果): 申请验收前全部不符合要求的管桩整改完成			
承包商:  质检员: 田建东 2020年 8月 6日		项目监理机构:  旁站监理人员: 王洪伟 2020年 08月 06日	

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-23

日期及气候	2020年08月08日 多云		
施工地点	21#方阵		
旁站监理的部位或工序	管桩打桩		
旁站监理开始时间	08:00	旁站监理结束时间	17:30
施工情况:	300吨打桩机3台. 400吨打桩机2台. 场地较为平整. 施工单位质检人员在岗		
监理情况:	管桩规格符合设计要求 质量证明文件齐全 表面感观合格		
发现问题:	21#方阵个别桩位偏差大于设计偏差		
处理意见:	要求施工单位安排人员对桩位偏差大的进行整改.		
备注 (包括处理结果):	无		
承包商:			
质检员:			
项目监理机构:			
旁站监理人员:			

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-24

日期及气候	2020, 08, 10		
施工地点	30#方阵		
旁站监理的部位或工序	预制管打桩		
旁站监理开始时间	2020.08.10. 8时	旁站监理结束时间	2020.08.10. 17.30.
施工情况:	300打桩机3台, 400打桩机1台, 场地平整较差, 施工员在场, 管桩规格、质量符合设计要求, 进场报验资料齐全.		
监理情况:	监理对施管桩进行检查, 表面感官质量符合要求.		
发现问题:	个别桩基南北向偏差大于设计要求		
处理意见:	要求安排非机械对不符合要求的管桩进行整改.		
备注 (包括处理结果):	申请验收前全部不符合要求管桩整改完成		
承包商:	 项目经理: <u>王洪伟</u> 质检员: <u>王洪伟</u> 2020年8月10日		
项目监理机构:	 旁站监理人员: <u>王洪伟</u> 2020年8月10日		

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-25

日期及气候	2020年08月08日 多云		
施工地点	10#方阵		
旁站监理的部位或工序	10#箱变基础浇筑		
旁站监理开始时间	11:00	旁站监理结束时间	13:00
施工情况:	混凝土工7人 模板工1人 满足现场要求 振捣器1台 质检员、取样员在岗,混凝土运来未起时,施工过程未加水.		
监理情况:	浇筑9m³ 标号C35. 制作试块1组同养. 1组标养, 坍落度实测160mm 符合要求, 收面未加水. 收面符合要求.		
发现问题:	基础梁个别部位未设垫块.		
处理意见:	要求施工队在对钢筋整改完成, 验收合格后进行浇筑.		
备注(包括处理结果):	已整改完成		
承包商:			
质检员:	田市强 崇明区陈家镇裕安养殖场 渔光互补110兆瓦EPC 光伏发电项目 2020年08月08日 (签约合同无效)		
项目监理机构:			
旁站监理人员:	冯永福 2020年08月08日		

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录



NO: CZZH-7105-ZL-26

日期及气候	2020年08月15日 多云		
施工地点	光伏区5#9#11#12#15#方阵		
旁站监理的部位或工序	箱变一机基础浇筑		
旁站监理开始时间	15:20	旁站监理结束时间	19:20
施工情况:	砼标号C35 浇筑45m ³ .已对取料制作试块试 砼施工人员8人.木工1人.人员满足现场要求		
监理情况:	质检员在岗.砼运送未超时.施工过程中未加水.收面符合要求.		
发现问题:	挑檐钢筋被踏踩变形.		
处理意见:	安排人员对变形钢筋进行整改完成后.进行浇筑.		
备注(包括处理结果):	已整改完成		
承包商:			
质检员:	田忠金 2020年8月15日		
项目监理机构:			
旁站监理人员:	阎永福 2020年08月15日		

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-27

日期及气候	2020年03月22日		
施工地点	13# 14# 16# 17# 18# 廊下		
旁站监理的部位或工序	箱变一体机浇筑		
旁站监理开始时间	15:00	旁站监理结束时间	18:30
施工情况:	砼施工人员2人,木工1人满足现场要求,商砼标号C35,浇筑 45m³.		
监理情况:	质检员在岗,砼运输未超时,施工过程加水,取样员进 行取样,但试块.		
发现问题:	基础收面不到位.		
处理意见:	要求安排人员仔细进行收面.		
备注(包括处理结果):	已整改完成.		
承包商:			
质检员:			
项目监理机构:			
旁站监理人员:			



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-23

日期及气候	2020年08月26日 晴		
施工地点	配电楼.		
旁站监理的部位或工序	配电楼地面梁浇筑.		
旁站监理开始时间	12:00	旁站监理结束时间	22:00
施工情况: 砼浇筑人员15人 木工2人 振捣器4台, 满足现场要求 砼标号C35P6 浇筑59m³.			
监理情况: 质检员在岗, 高砼运输未超时, 施工过程中未加水. 取样员按要 求进行取样.			
发现问题: 混凝土试块制作不足.			
处理意见: 要求混凝土试块制作数量需满足规范要求.			
备注 (包括处理结果): 无			
承包商: 质检员: 田建军 2020年8月26日	项目监理单位: 上海电力工程 旁站监理人员: 黎建光 2020年08月26日		

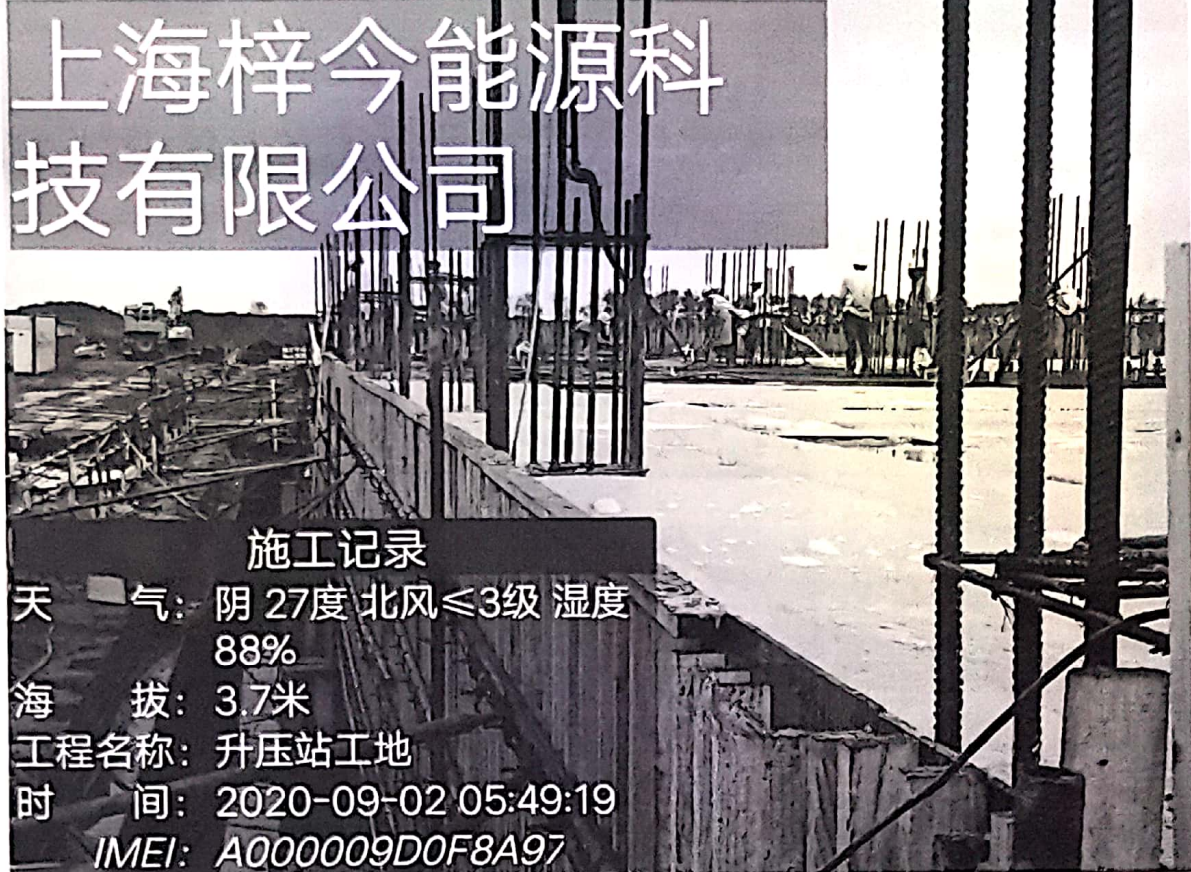
崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-29

日期及气候	2020年08月28日 晴		
施工地点	升压站配电楼.		
旁站监理的部位或工序	配电楼基础梁浇筑.		
旁站监理开始时间	07:00	旁站监理结束时间	14:10
施工情况: 砼施工人员10人 木工2人捣振器3台 满足现场要求 商砼标号C35P6 浇筑195m³.			
监理情况: 质检员在浇筑过程中随时抽查,发现砼坍落度未加水,取样员按 要求进行取样.			
发现问题: 基础梁个别无垫块.			
处理意见: 要求对缺少垫块部位增加垫块.			
备注(包括处理结果): 已整改完成.			
承包商: 质检员: 田照合 2020年08月28日	项目监理机构: 旁站监理人员: 徐建文 2020年08月28日		



上海梓今能源科技 有限公司



施工记录

天 气: 阴 27度 北风 $\leq$ 3级 湿度
88%
海 拔: 3.7米
工程名称: 升压站工地
时 间: 2020-09-02 05:49:19
IMEI: A000009D0F8A97

旁站监理记录

日期及气候		2020年09月03日 晴	
施工地点		19# 20# 21# 22# 23# 24# 25# 26# 27# 28# 29# 30# 31# 32# 33# 34# 35# 36# 37# 38# 39# 40# 41# 42# 43# 44# 45# 46# 47# 48# 49# 50# 51# 52# 53# 54# 55# 56# 57# 58# 59# 60# 61# 62# 63# 64# 65# 66# 67# 68# 69# 70# 71# 72# 73# 74# 75# 76# 77# 78# 79# 80# 81# 82# 83# 84# 85# 86# 87# 88# 89# 90# 91# 92# 93# 94# 95# 96# 97# 98# 99# 100#	
旁站监理的部位或工序		浇筑混凝土	
旁站监理开始时间	13:00	旁站监理结束时间	17:30
施工情况: 施工人员 12 人 振捣器 2 台, 满足现场要求, 旁站记录 共 35 方, 浇筑 70m³			
监理情况: 质检员在旁站监理未超时, 施工过程未加水, 取样员按 规范要求进行检测。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果): 无			
承包商:  质检员: 田建合 2020年9月8日		项目监理机构:  旁站监理人员: 周飞 2020年09月08日	

