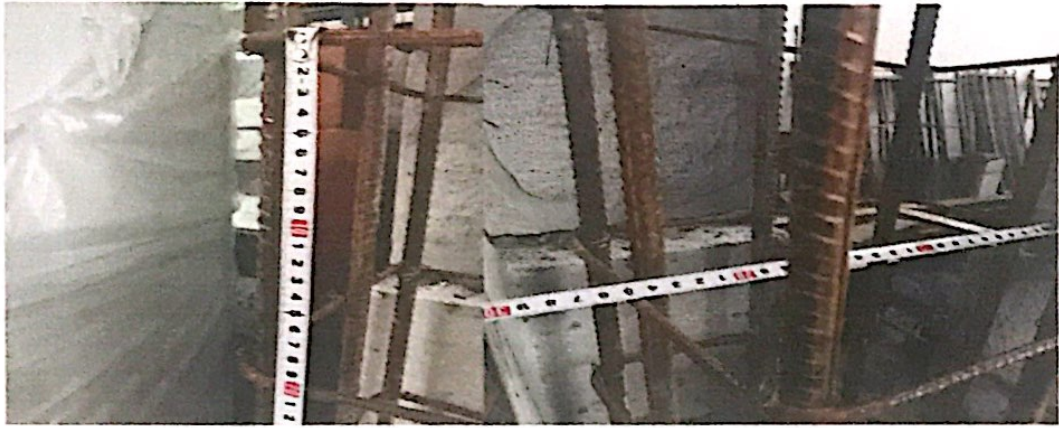


旁站监理记录表

工程名称: 芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-001

日期及气候: 2020 年 07 月 20 日	工程地点: 芜湖市三山区远景塑料
旁站监理的部位或工序: 配电房构造柱与圈梁混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2020.07.20 6:30	旁站监理结束时间: 2020.07.20 11:30
施工情况: 准备: 1、浙江华凯电力工程有限公司施工负责人魏单森, 施工人员 6 人。2、主要设备: 1 台混凝土搅拌机、振动棒 2 台、铁抹子、小车、铁锹; 3、砼强度等级 C30 自拌砼。 施工工艺: 基层处理→操平标高→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养	
	
监理情况: 1、施工前对班组进行安全技术交底; 2、控制轴线情况, 检查施工方人料机准备情况; 3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工, 管理人员到位; 4、检验到场混凝土的配合比; 5、做好试块制作旁站监督工作, 要求制作人员持证上岗, 本次混凝土试块现场取样 2 组, 并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备 注:	
施工项目部: 浙江华凯电力工程有限公司 质 检 员: 李东青 日 期: 2020 年 7 月 20 日	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: [Signature] 日 期: 2020 年 7 月 20 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建
