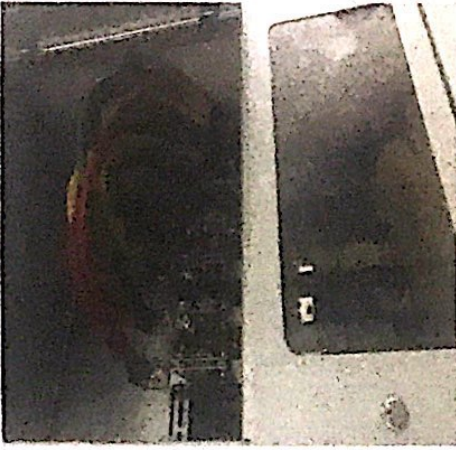
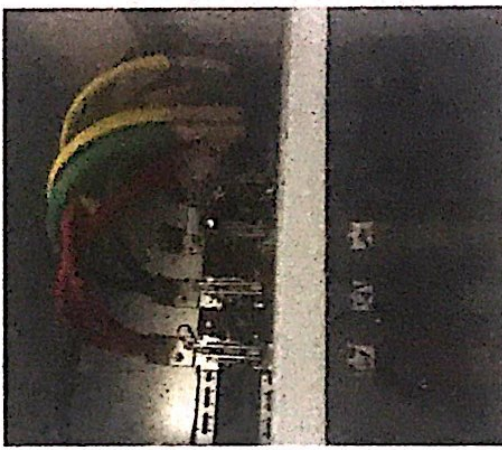


旁站监理记录表

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-001

日期及气候：2020 年 7 月 25 日	工程地点：安徽省芜湖市三山区远景塑胶
旁站监理的部位或工序：3*240、3*150、3*120 电缆头接线	
旁站监理开始时间：2020.07.25 7:00	旁站监理结束时间：2020.7.25 23:30
施工情况： 准备：1、浙江华凯电力工程有限公司负责人魏单淼，施工人员 8 人。2、主要设备：电缆剥皮削刀、铜接头、压钳、锯钢甲； 施工工艺：电缆头防潮→手、工具、材料清洁→电缆附件预先试装→剥皮绝缘层→铜屏蔽层处理→清洁主绝缘层表面→安装半导电管→接线。  	
监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底；2、检查施工方人料机准备情况；3、电缆敷设接线时要求施工方按施工方案组织施工，管理人员到位；4、检查施工材料是否完好；5、制作旁站监督工作，要求制作人员持证上岗。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：浙江华凯电力工程有限公司 质 检 员：李荣春 日 期：2020 年 7 月 25 日	监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：[Signature] 日 期：2020 年 7 月 25 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建
