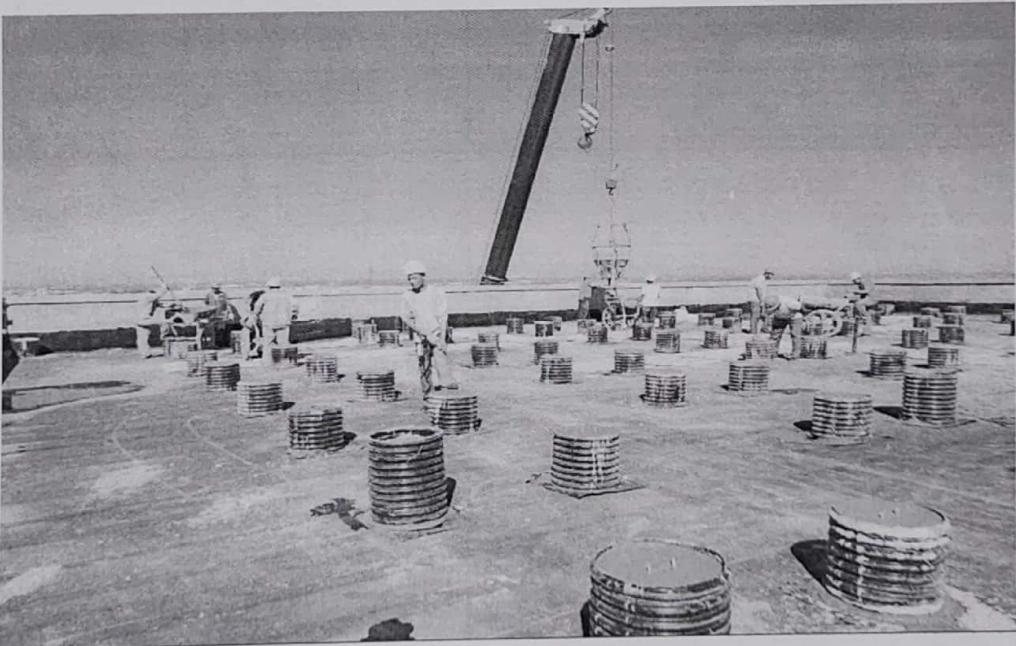



旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业5.99MW及5.98MW分布式光伏发电项目

编 号: JSHJT-PZJL-20200918

日期及天气: 2020年09月18日	施工单位: 上海电力安装第一工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 南和厂区制粉车间5混凝土屋顶配重砣浇筑	
旁站监理开始时间: 08:00	旁站监理结束时间: 10:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、制粉车间5混凝土屋顶配重砣浇筑预制墩。 2、现场施工人员: 20人, 管理人员: 3人。 3、施工机械: 吊车1辆(冀ETS4976), 商砼车1辆(冀ET6005), 震动棒1把, 手推车5辆。 4、图纸要求混凝土强度等级达到C25强度, 现场采用C25强度商品砼, 符合图纸要求。现场在浇筑过程中要求工人对楼面保护好的同时进行浇筑砣, 在模具内混凝土振捣充分, 作业安全进行, 施工过程符合要求。	
	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 	2020年09月18日

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部留存。

