


旁站记录表

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-PZJL-010

日期及气候: 2021 年 1 月 22 日 小雨	施工地点: 水泵车间
旁站监理的部位或工序: 水泵车间电缆洞开孔	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 10:30
施工情况: 施工人员 10 人, 管理人员 1 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。	
	
监理情况: 1、施工人员到岗, 电镐设备良好。 2、核对图纸, 根据现场电缆实际下设敷设。 3、屋外拉好警示带并排专人开户防止落石伤人。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 施工完毕后要求施工方对施工垃圾进行清理工作。	
承包单位: 四川胜邦建筑工程有限公司 施工负责人: 徐国江 日期: 2021 年 1 月 22 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 张良兵 日期: 2021 年 1 月 22 日

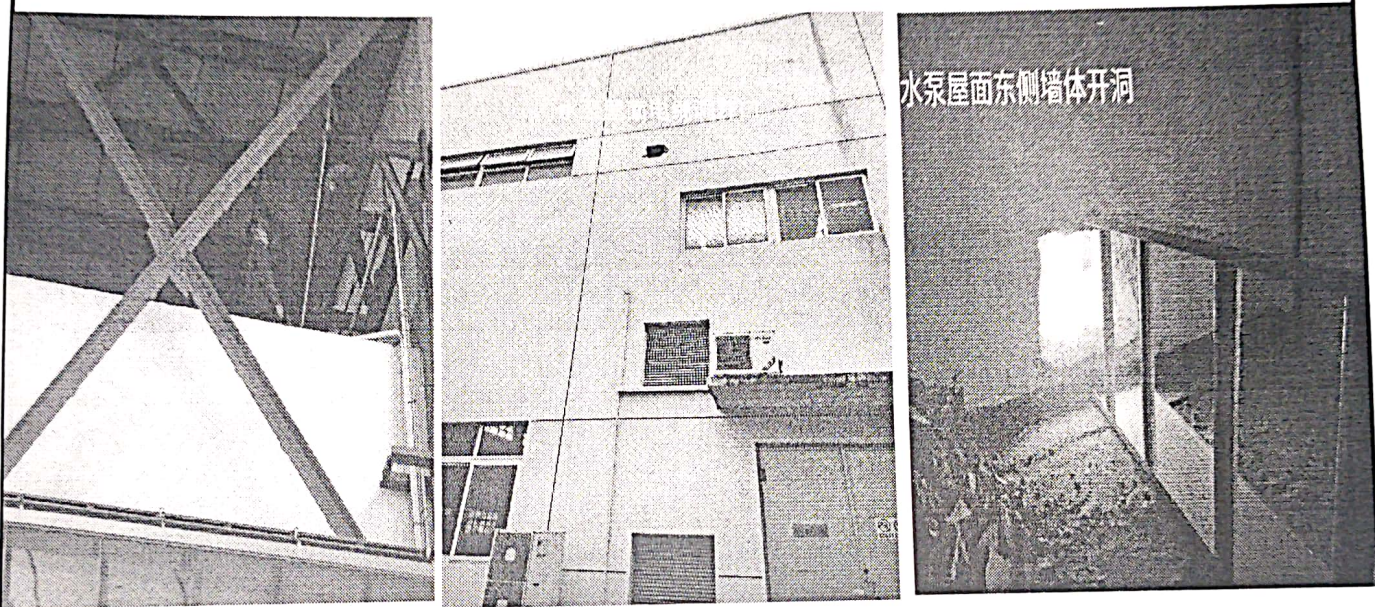

扫描全能王 创建
