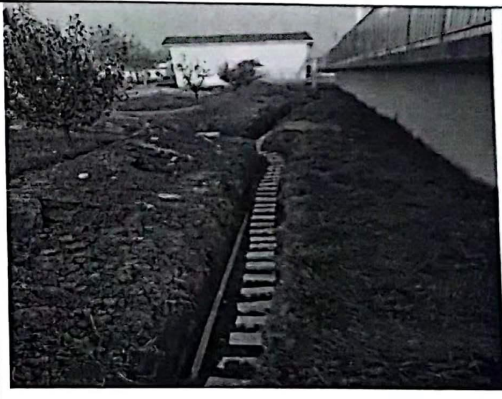


旁站监理记录表

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：HZGF-TJ-B009-0020

日期及气候：2021.11.13 气候 多云	工程地点：光伏 A 区北侧
旁站监理的部位或工序：A 电缆沟回填	
旁站监理开始时间：13:40	旁站监理结束时间：17:10
施工情况： 1、施工负责人在岗指挥回填。 2、施工工艺符合施工验收规范规定及设计标准。	
监理情况： 旁站记录过程： 2021 年 11 月 13 日下午 1 时开始回填，回填前检查接地施工接地极已焊接，搭接处已做防腐，搭接面基本符合规范要求电缆上层覆盖软土后进行盖砖，交叉电缆沟处已做封堵，要求回填后做好地面恢复安置电缆桩。	
 	
发现问题：	
处理意见：	
施工单位（章）： 质检员： <u>张磊</u> 2021 年 11 月 13 日	项目监理部（章）： 旁站监理人员： <u>张锐</u> 2021 年 11 月 13 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。
