

旁站监理记录表

工程名称： 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号： ZHJL-DXPZ-002

日期及气候： 2020、12、05 晴转多云 5℃-11℃	打桩地点： 4 区
旁站监理的部位和工序： 4 区 2 排、3 排 9 米、6 米管桩	
旁站监理开始时间： 8: 10	旁站监理结束时间： 10: 26
施工（打桩）情况： 1、高程控制点已测放完成，并经验收符合要求； 2、GPS 定位放点完成，放点定位准确； 3、使用 PHC-A-300/70 预应力管桩，技术人员进行了打桩前技术交底； 4、打桩现场 1 人看标高，1 人看水平，定点 1 人，扶桩 2 人，现场负责人 2 人； 5、施工机械：打桩机 1 台，挖掘 1 台，拖拉机 1 台； 6、拖拉机将 9 米管桩从堆放点运至打桩点，桩机使用专用的吊钩夹具起吊管桩； 7、桩机专用夹具夹紧管桩桩头，起吊提升到垂直状态，然后将管桩准确地放到管桩点位，扶桩人员辅助扶正后，桩机缓慢施压将桩插入 0.5m 处停止施压，调正桩身垂直度，再利用桩机施压缓慢连续压至规定标高，遇坚硬土层，桩机开启高频振动装置，直至压到规定标高； 8、打桩见附件图；	
监理情况： 1、旁站监理 1 人，施工前检查施工单位人员配备、设备准备已到位； 2、核对、检查管桩的型号规格、外观无损伤； 3、检查现场技术管理人员、安全员到岗情况，符合要求； 4、要求东南角高坡先挖孔后压桩； 5、管机压桩过程指挥、配合有序，压桩深度和标高，符合要求； 6、压桩现场安全防护工作良好；	
发现问题 东南角土质较硬，挖机挖深后压桩。	
处理意见： 要求施工单位按制方案实施。	
备注（包括处理结果）： 已按要求执行	
承包单位： <u>四川协佳工程设计有限公司</u> <u>无锡镛正能源科技有限公司</u> 质 检 员： <u>李耀明</u> 日 期： 2020 年 12 月 05 日	项目监理机构： <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员： <u>秦辉宇</u> 日 期： 2020 年 12 月 05 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存_____份。

附件




(图 1)



(图 2)



(图 3)

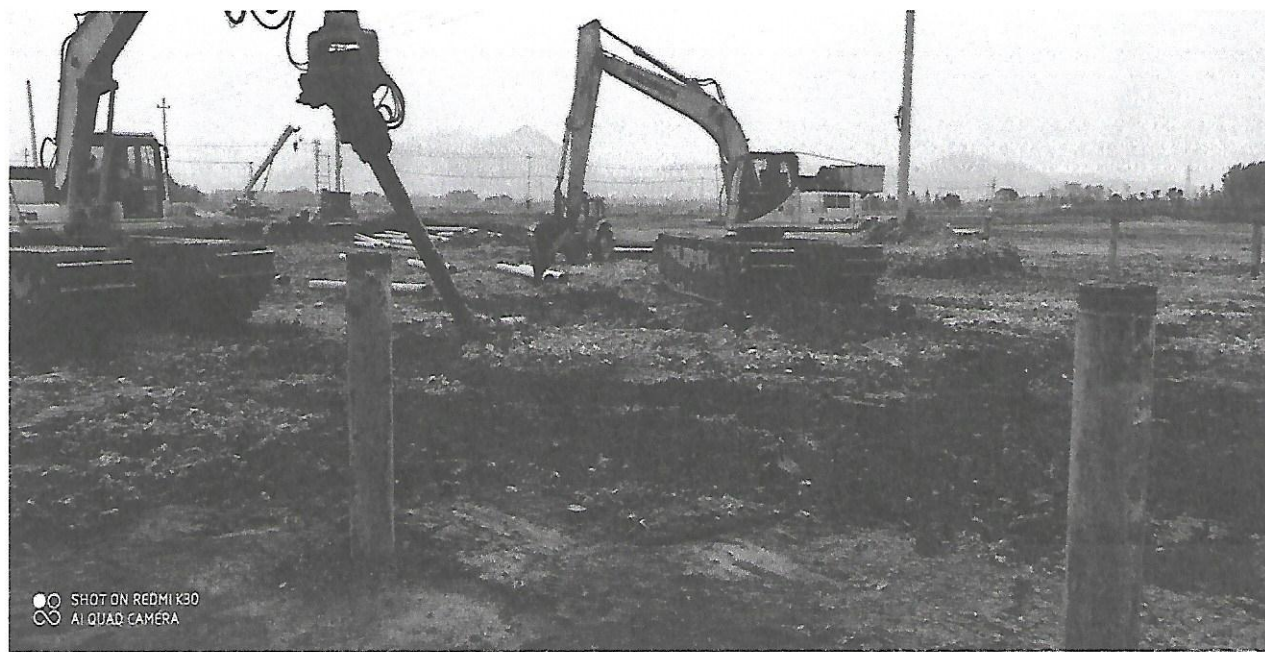

(图 4)
