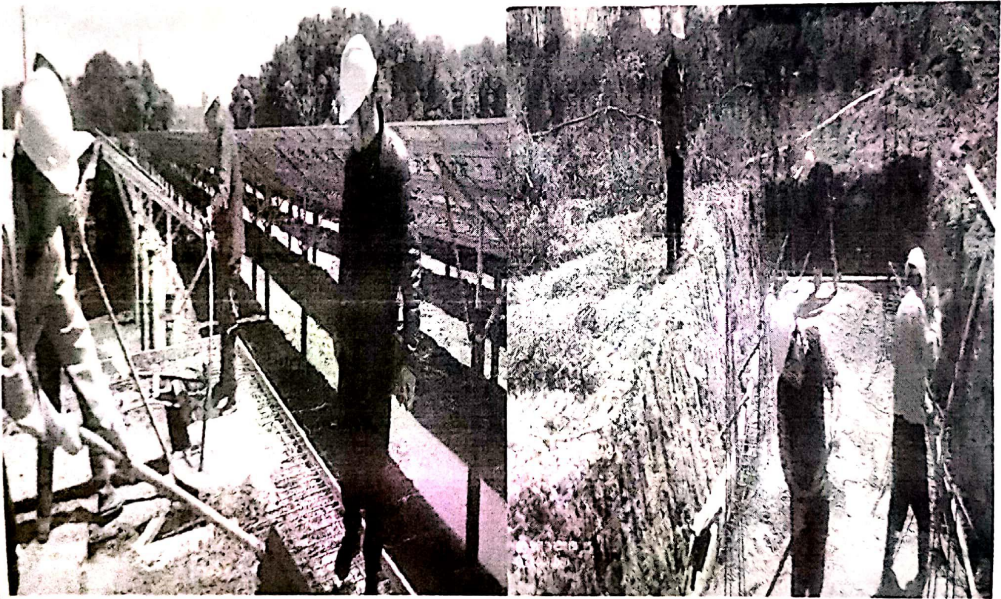



旁站记录表

工程名称：增资新建球溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：ZHLJ-DXPZ-006

日期及气候：2021.04.09	地点：3#4#箱变
旁站监理的部位或工序：箱变基底浇筑	
旁站开始时间：2021 年 04 月 09 日 08 时	旁站结束时间：2021 年 04 月 09 日 15 时
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 浇筑前，施工人员机械已准备到位，由施工单位土建负责人浇筑施工交底，安全交底，然后开始施工，混凝土标号 C25，共用混凝土浇筑 10.8 m³ 	
监理情况： 现场监理检查钢筋绑扎及模板几何尺寸均符合要求，商品混凝土运送至现场检查出厂证明，合格证，要求现场制作试块，进行同条件养护，作为验证配合比证据，混凝土振捣时做到快插慢拔，振捣器插点均匀，连续振捣时间均为 25-40s，已混凝土表面出现符浆为止，没有漏浆及跑浆现象，浇筑完成后要求施工方做好保湿养护，未发现其他问题。 旁站监理人员（签字）：  2021 年 04 月 09 日	
